

【資料】

●年間スケジュール


整備関連

人材育成

広報関連

イベント

網野銚子山プロジェクト

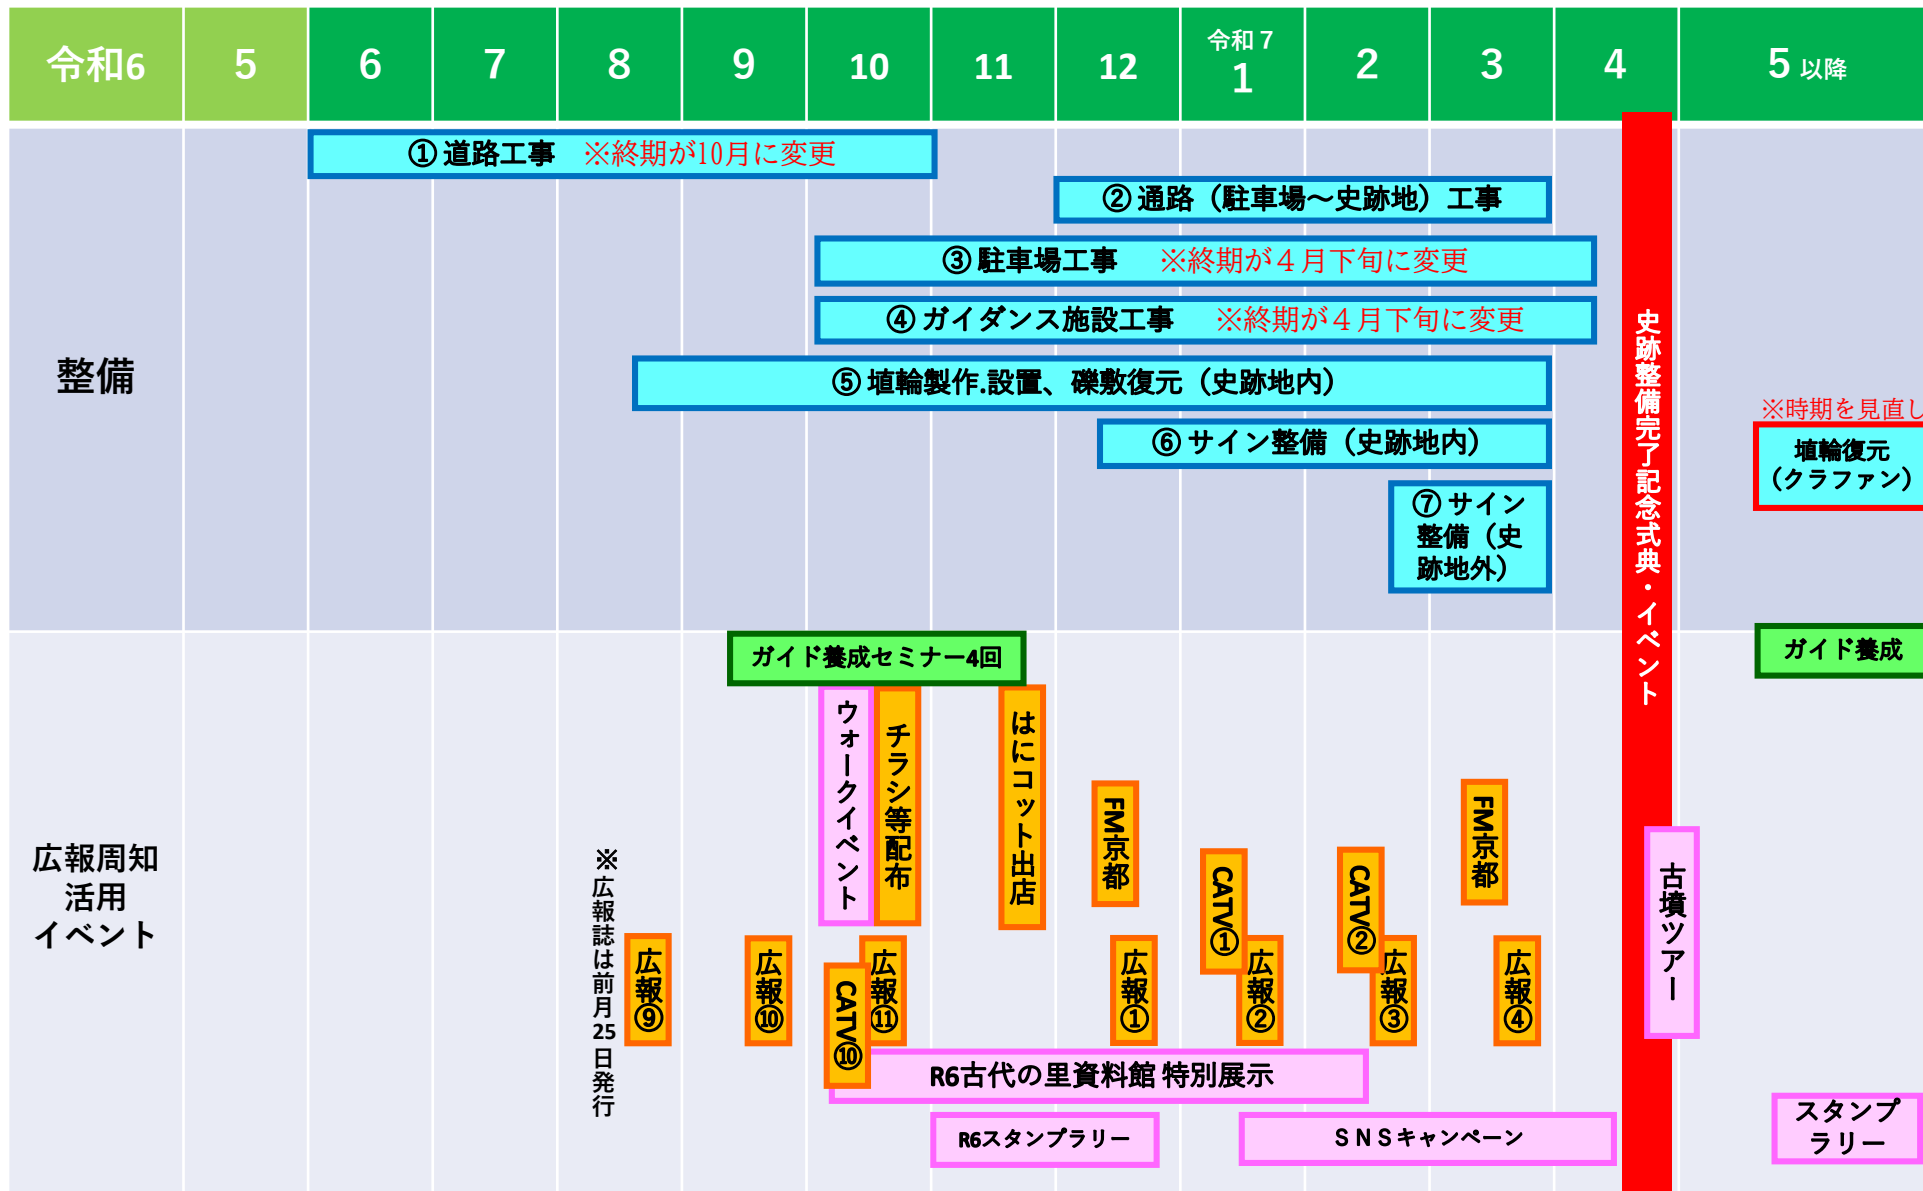



① R6 道路工事 (市道林線及び大將軍線 舗装工事)

完成済

② R6 通路工事 (市道林宮家線・寛平法皇線 舗装工事)

【施工期間】～令和7年3月31日

⑦ R6 誘導看板設置 2ヶ所

完成済



⑦ 看板設置状況



③ 駐車場 4月下旬 完成予定


面積 約2300㎡ アスファルト舗装

大型バス：4台

普通自動車：24台



車椅子対応：2台

二輪車：7台

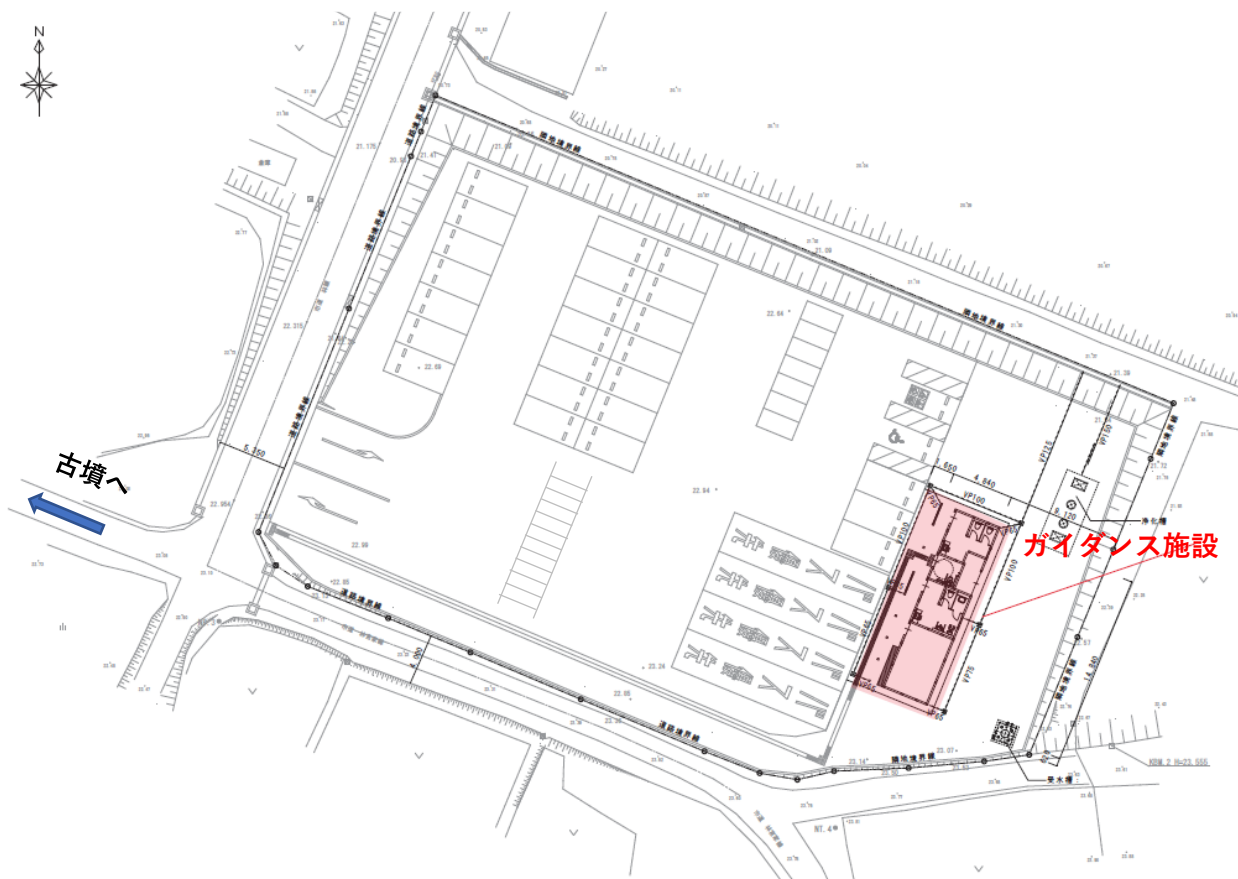

③ 駐車場工事の状況 3月中旬

④ガイダンス施設 4月下旬 完成予定
木造平屋建て 建築面積 約74㎡

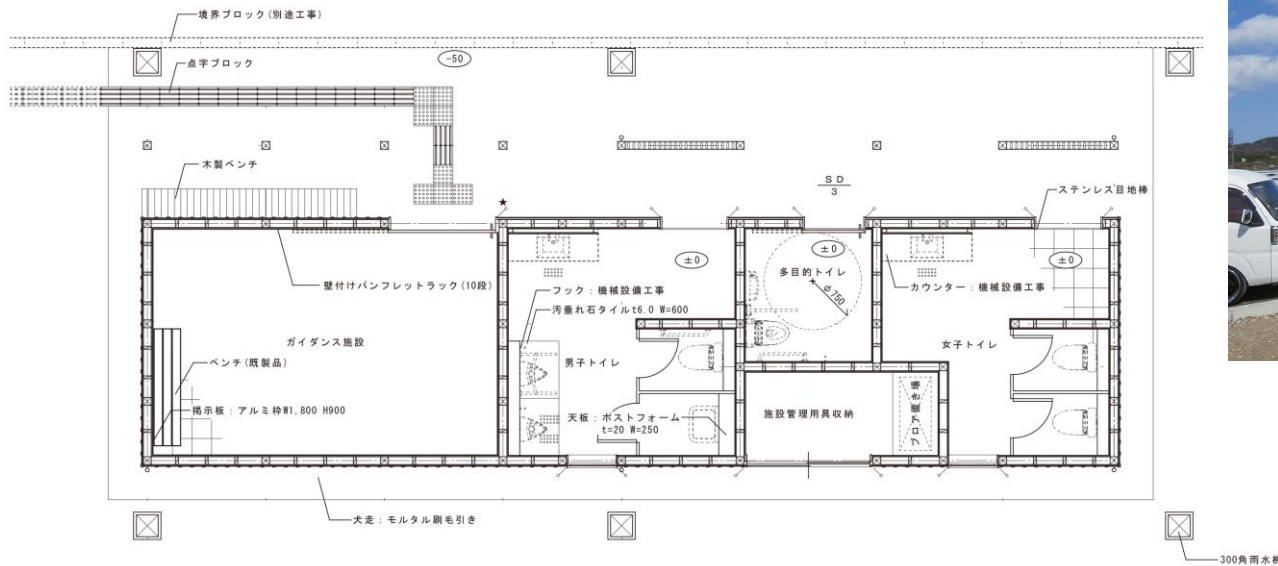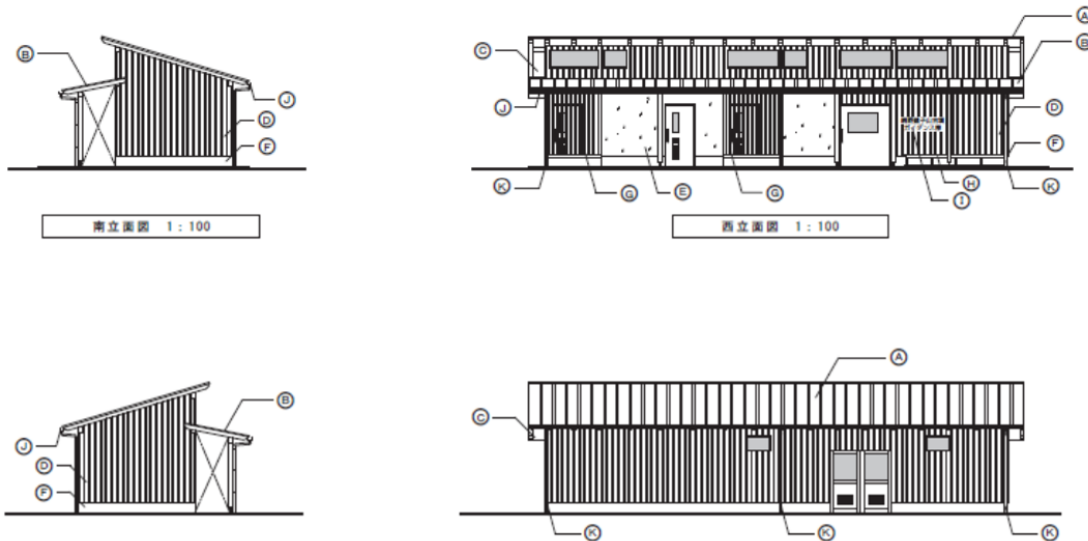

③ガイダンス施設工事の状況 3月中旬

出さない資料：前回説明したものの

R6 埴輪復元（ガバメント・クラウドファンディング）

網野銚子山プロジェクト

【CF実施期間】 令和7年3月～令和7年5月（予定）※時期を見直し

【施工期間】 令和7年6月～令和8年3月下旬（予定）※時期を見直し

【内容】 ⑤-1の復元埴輪に加え、ガバメント・クラウドファンディングを活用し、民間から寄付を募り復元埴輪を設置する。

当初目標は100本。設置位置は⑤-1に連なる1段目テラス。

復元埴輪は1基55万円＋施工費

単価的に1人1基は難しいので、人数割りの最低金額の設定が必要。1口20,000円から複数プランを設定予定。

⑦ R6 サイン整備（史跡地外）

【施工期間】 ～令和7年3月下旬（予定）

※2基取替から2基撤去に変更

【内容】 駐車場への誘導サイン2か所新設（7頁④・⑤）、既存サイン（本覚寺傍）2か所（7頁②・③）撤去。
