

令和 5 年度 第 3 回
京 丹 後 市 史 跡 整 備 検 討 委 員 会

網野鈔子山古墳整備に関する
協 議 用 資 料

1. 令和 5 年度網野鈔子山古墳整備内容.....	1
2. 令和 6 年度網野鈔子山古墳整備予定.....	12

令和 6 年 3 月 15 日
京 丹 後 市

1. 令和5年度 史跡網野銚子山古墳整備内容

(1) 整備概要

令和5年度は国庫補助事業にて墳丘保存及び遺構復元・表示、園路や排水施設等整備を進めている。

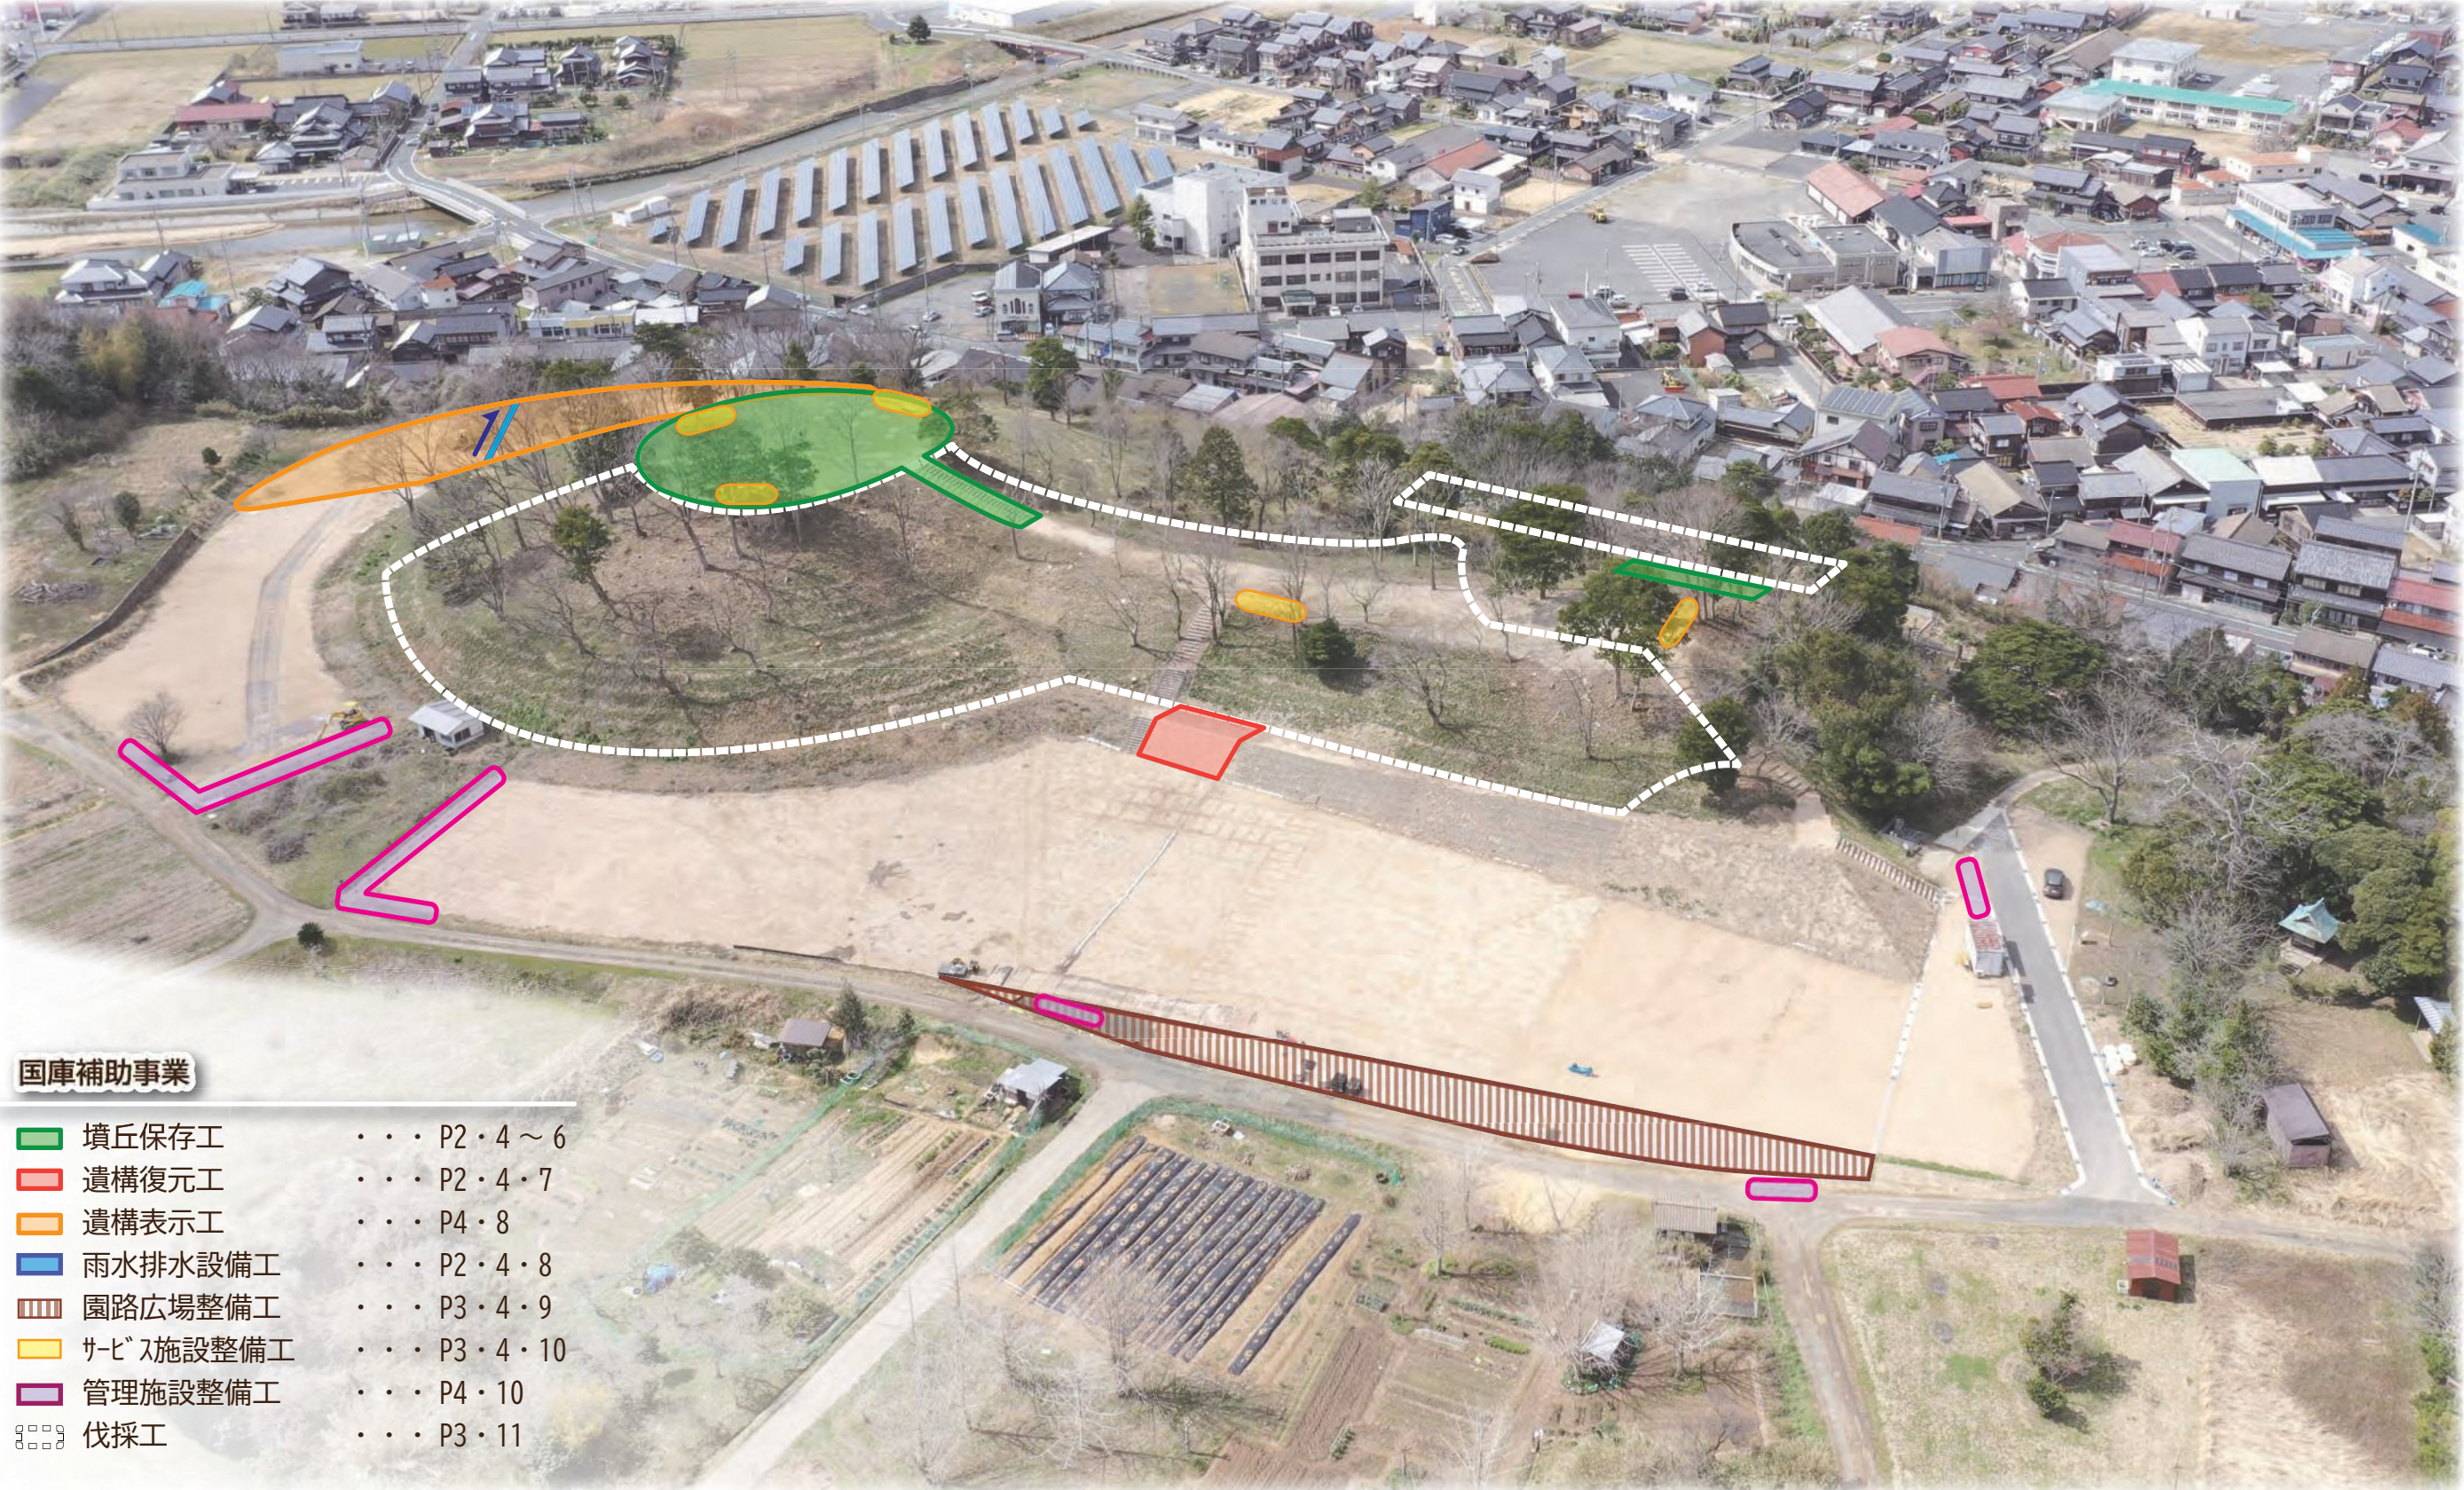


図 1-1 整備概要図

駐車場整備予定地の上空（70m付近）から撮影 2024. 3. 10

(2) 整備写真

墳丘保存工 ― 埋戻し



撮影日 2024. 3. 10

墳丘保存工 ― 土のう工1



撮影日 2024. 3. 10

墳丘保存工 ― 土のう工2



撮影日 2024. 2. 15

遺構復元工 ― 葺き石




撮影日 2024. 3. 10

遺構復元工 ― 葺き石（ドローン画像）



撮影日 2024. 3. 10

雨水排水設備工 ― 流末

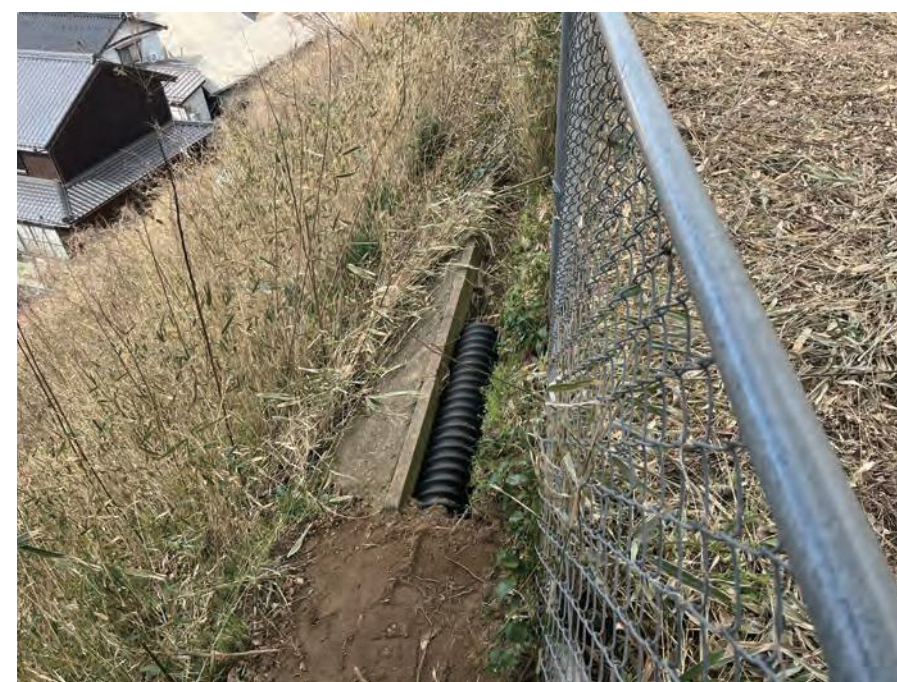

撮影日 2024. 3. 10

園路広場整備工 ― 擬石舗装



撮影日 2024. 3. 10

サービス施設整備工 ― ベンチ



撮影日 2024. 3. 10

伐採工 ― 網野庁舎からの眺め



撮影日 2023. 5. 9



撮影日 2024. 3. 10

古墳環境整備
数量表

記号	工種	種別	細別・規格	単位	数量	備考
■	仮設工	工事用道路工	敷鉄板設置・撤去 1	m ²	306.0	68枚, 1.5×3.0×68
			敷鉄板設置・撤去 2	m ²	85.5	19枚, 1.5×3.0×19
			敷鉄板設置・撤去 3	m ²	387.0	86枚, 1.5×3.0×86
			鋼板賃料	枚	86.-	現場内流用, 重量0.8×86=68.8t
●	墳丘保存工	墳丘保存盛土	埋戻し	m ³	3.5	現場内発生土使用
			人力運搬(積込み・運搬・取卸し)	m ³	3.5	
		地被類植栽工	張芝工	m ²	37.3	
▨		土のう工	土のう工 1	袋	357.-	現場内発生土中詰7.1m ³ , 0.02×357
			吸出し防止材設置	m ²	75.0	
			土のう工 2	袋	375.-	現場内発生土中詰7.5m ³ , 0.02×375
			人力運搬(積込み・運搬・取卸し)	m ³	14.6	7.1+7.5
▨	遺構復元工	作業土工	掘削	m ³	14.6	
		石敷き工	葺き石	m ²	49.5	支給石
		土のう工	土のう工 3	袋	20.-	発生土中詰0.4m ³ , 0.02×20

記号	工種	種別	細別・規格	単位	数量	備考
▨	遺構表示工	播種工	種子吹付	m ²	1,500.0	
—	雨水排水設備工	側溝工	U型側溝	m	20.0	グレーチング 蓋
			蓋版 2	枚	22.-	景観グレーチング 300用
			蓋版 3	枚	22.-	景観グレーチング 240用
		管渠工	波状管 L=6.0m	式	1.0	既存水路へ接続
		集水樹・マンホール工	集水樹 現場打ち	基	1.-	450×450, 集水樹蓋450用
■	園路広場整備工	舗装工	擬石舗装	m ²	321.2	
—	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	ベンチ	基	8.-	
	管理施設整備工	柵工	ブー擬木柵	m	51.0	24+27=51
		車止め工	車止め 1	基	8.-	表示板付き
			車止め 2	基	2.-	表示板なし
	構造物撤去工	作業土工	土砂等運搬(処分)	m ³	64.2	数量計算書参照

● 墳丘保存工
埋戻し 3.5m³
張芝工 37.3m²
土のう工 1 357袋
吸出し防止材設置 75.0m²
図2参照

遺構表示工
種子吹付 1,500.0m²
雨水排水設備工
U型側溝 20.0m 蓋版 1 U240用 20枚
波状管 L=6.0m 1式
集水樹 1基
図5, 6参照

サービス施設整備工
ベンチ 4基
墳頂部, 図8参照

サービス施設整備工
ベンチ 2基
前方部, 図8参照

墳丘保存工
土のう工 2 375袋
図5参照

管理施設整備工
車止め 1 1基
車止め 2 2基
図8, 11参照

遺構復元工
掘削, 葺き石, 土のう工 3
図4参照

サービス施設整備工
ベンチ 2基
周壕部, 図8参照

仮設工
敷鉄板設置・撤去 2 85.5m²
19枚, 1.5×3.0×19

仮設工
敷鉄板設置・撤去 3 387.0m²
86(84+2)枚, 1.5×3.0×86

敷鉄板 2枚
敷鉄板設置・撤去 3に含む

管理施設整備工
車止め 1 1基
図8, 10参照

管理施設整備工
車止め 1 2基
図8, 10参照

仮設工
敷鉄板設置・撤去 1 306.0m²
68枚, 1.5×3.0×68

管理施設整備工
ブー擬木柵 51.0m
24+27m
図8, 9(施設配置図1)参照

管理施設整備工
車止め 1 4基
図8, 9参照

雨水排水設備工
蓋版 2 景観グレーチング 240用 22枚
図10参照


園路広場整備工
擬石舗装 321.2m²
図7参照

雨水排水設備工
蓋版 1 景観グレーチング 300用 22枚
図10参照

※敷鉄板は現場内で流用すること。
※施工箇所は監督員立会の上、決定すること。
※切板石張舗装の仕様については別途指示する。


A1版を50%縮小

令和5年度			
工事名	史跡銚子山古墳環境整備工事		
図面名	全体平面図		
縮尺	1／500	図面番号	1／13
設計	(株)空間文化開発機構		
京丹後市			

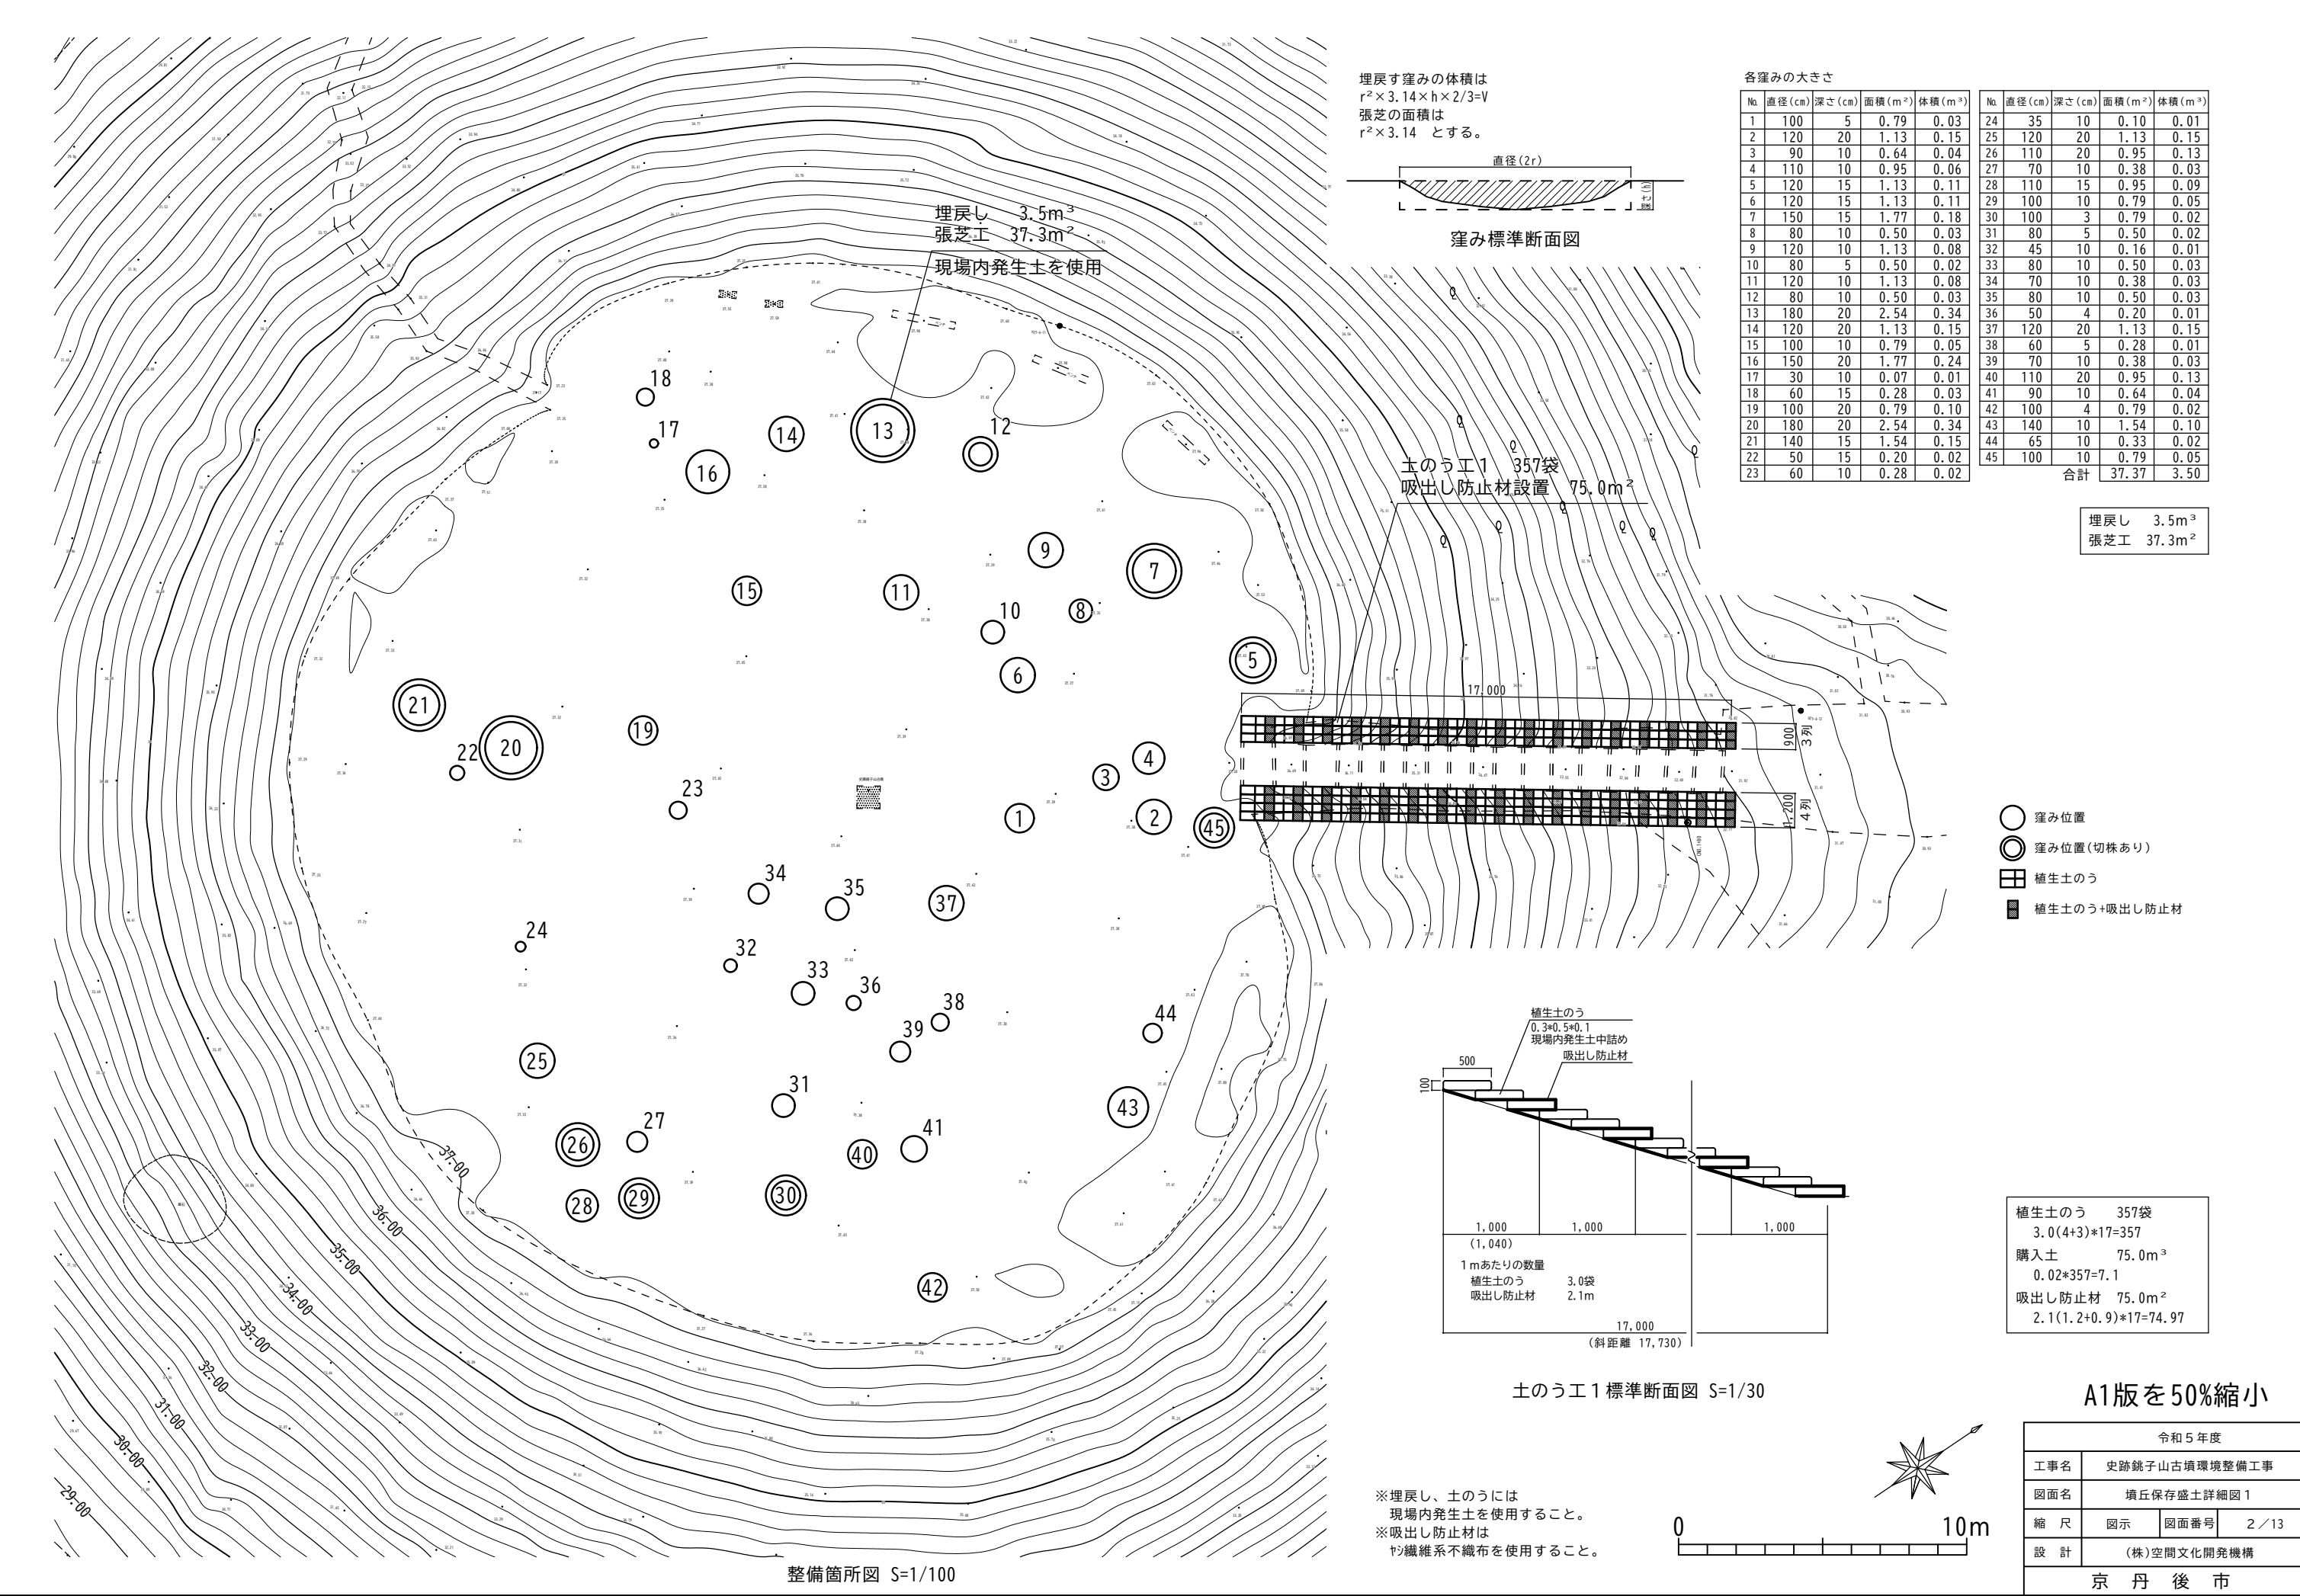




令和5年度			
工事名	史跡銚子山古墳環境整備工事		
図面名	墳丘保存盛土詳細図2		
縮尺	図示	図面番号	3/13
設計	(株)空間文化開発機構		
京丹後市			

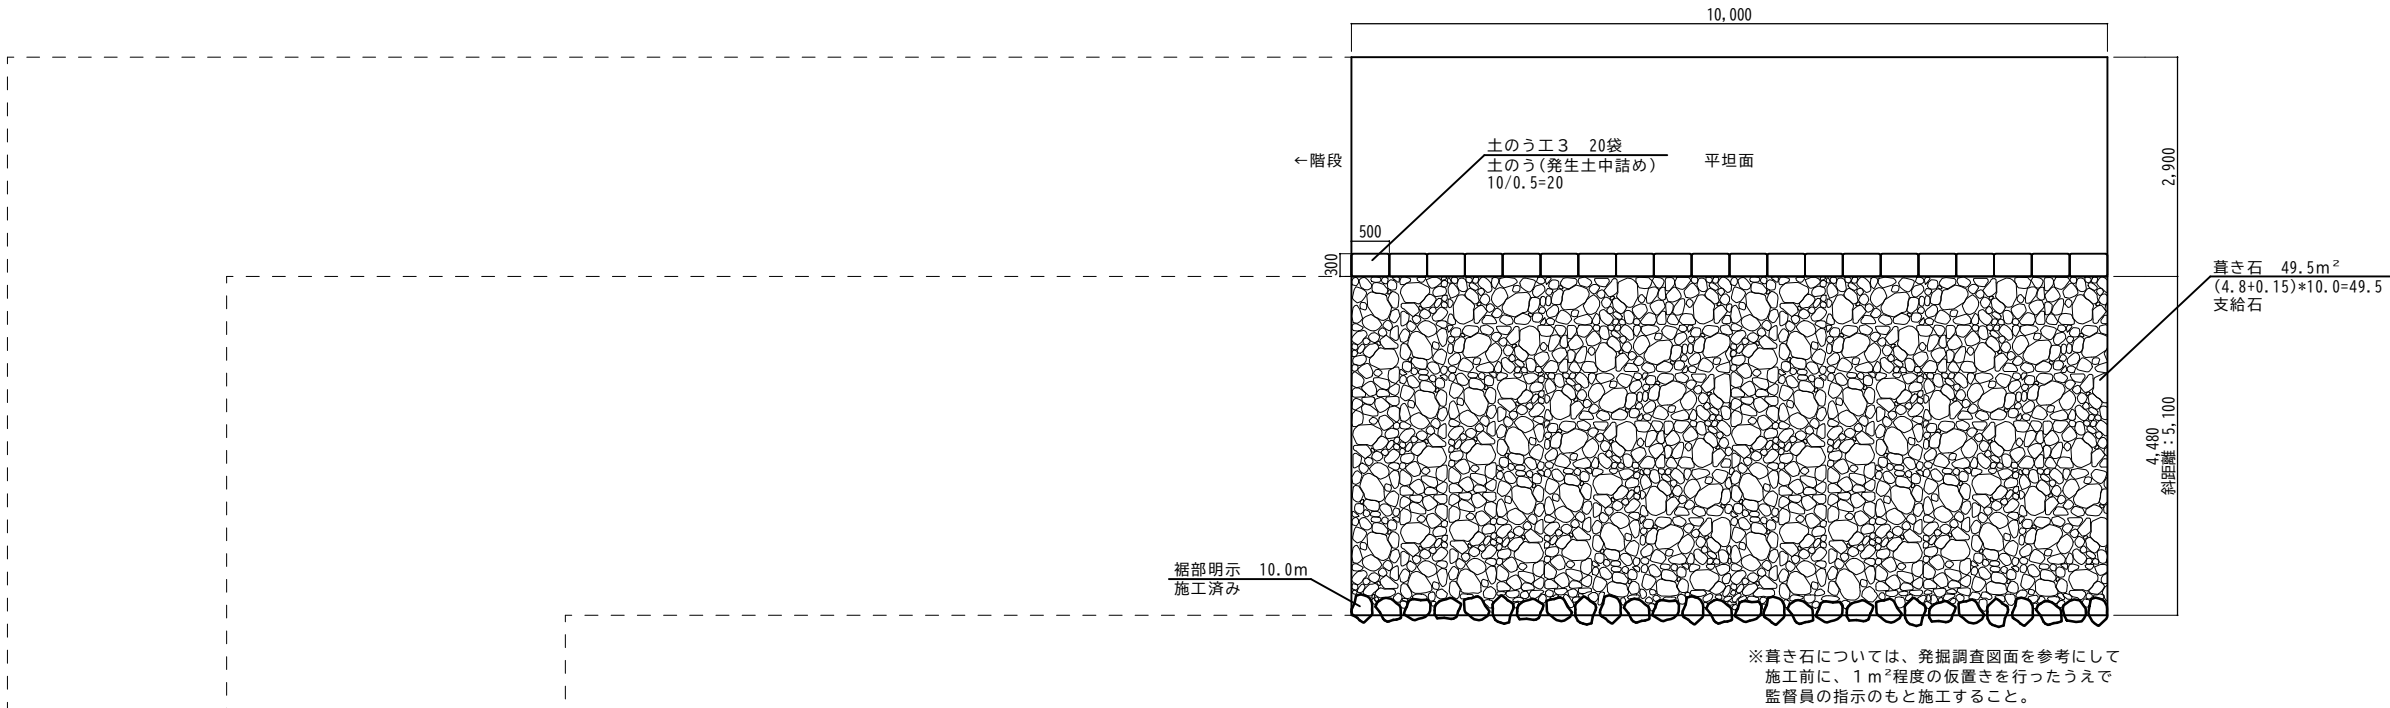

遺構復元工平面図 S=1/50

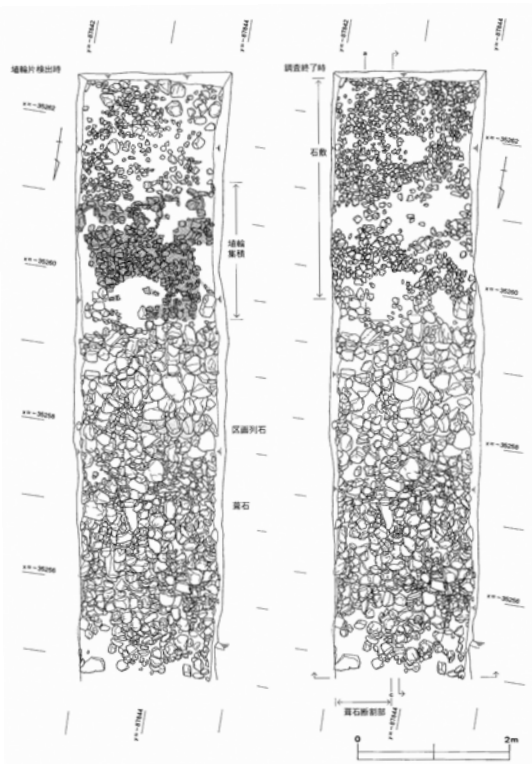

トレンチ遺構図 S=1/50




トレンチ遺構拡大図 S=1/25

遺構復元工標準断面図 S=1/50

※葺き石については、発掘調査図面を参考にして 施工前に、1 m²程度の仮置きを行ったうえで 監督員の指示のもと施工すること。


A1版を50%縮小

令和5年度			
工事名	史跡銚子山古墳環境整備工事		
図面名	遺構復元工詳細図 1		
縮 尺	図示	図面番号	4 / 13
設 計	(株)空間文化開発機構		
京 丹 後 市			

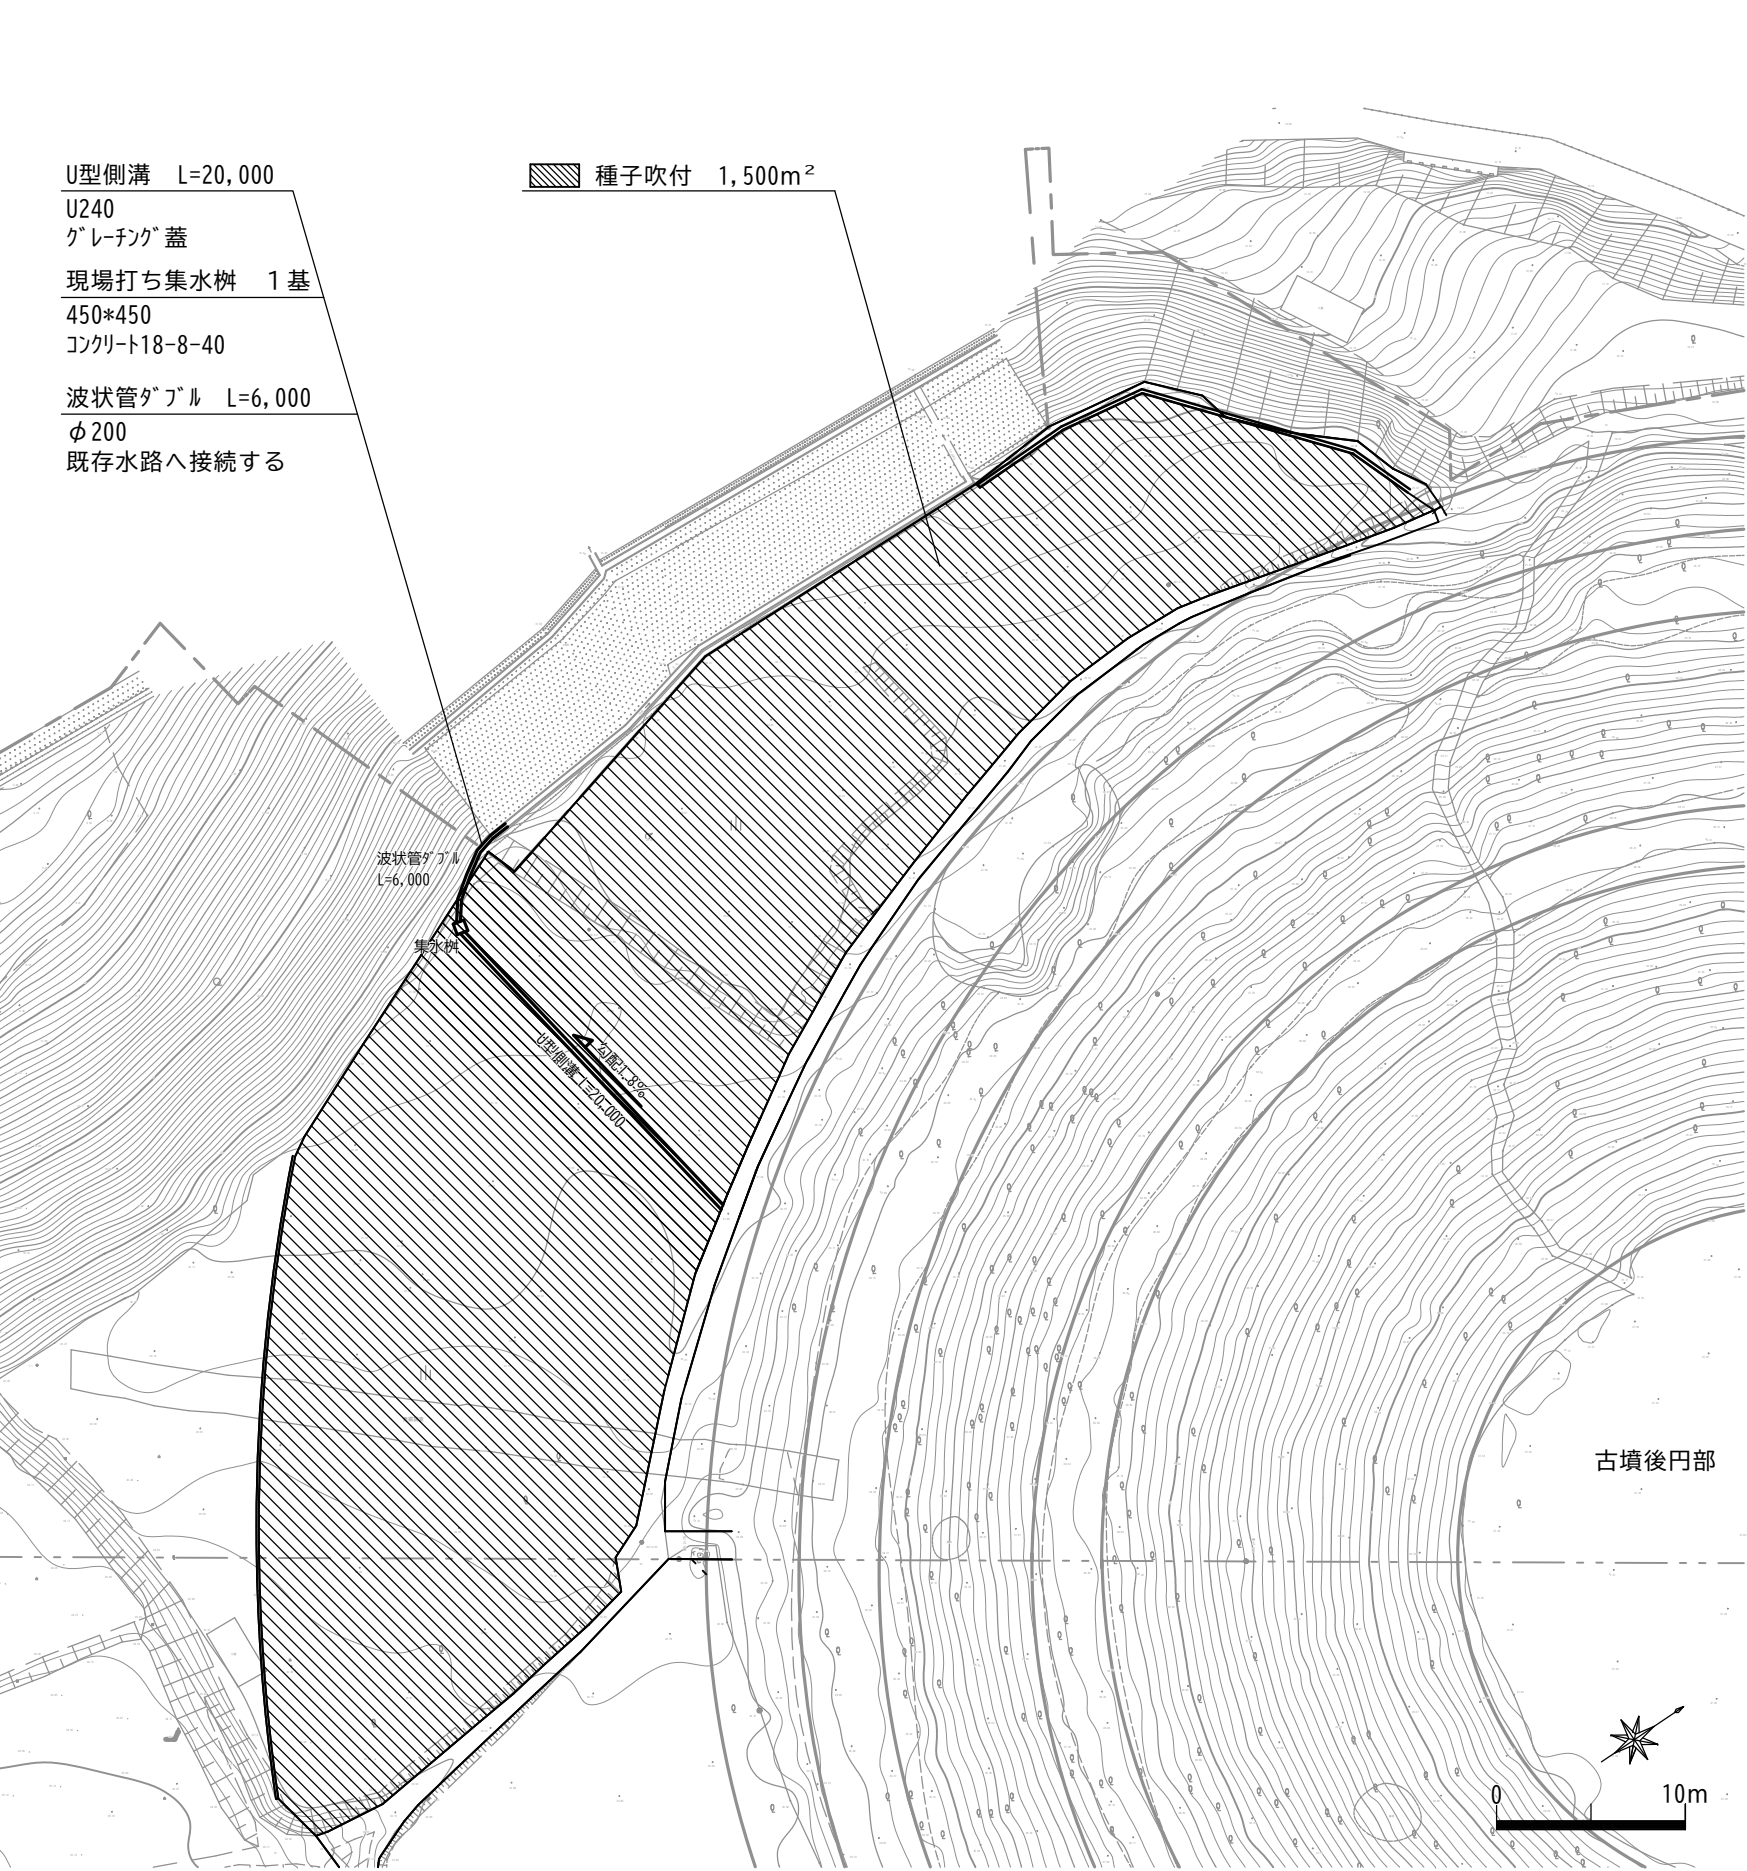


整備箇所図 S=1/200


史跡指定範囲




種子吹付標準断面図 S=1/10

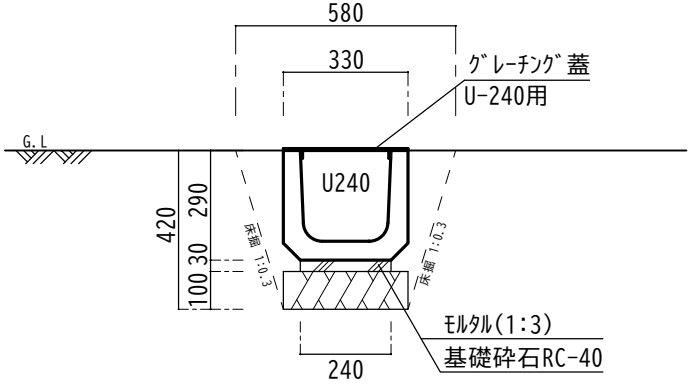

U型側溝標準断面図 S=1/10

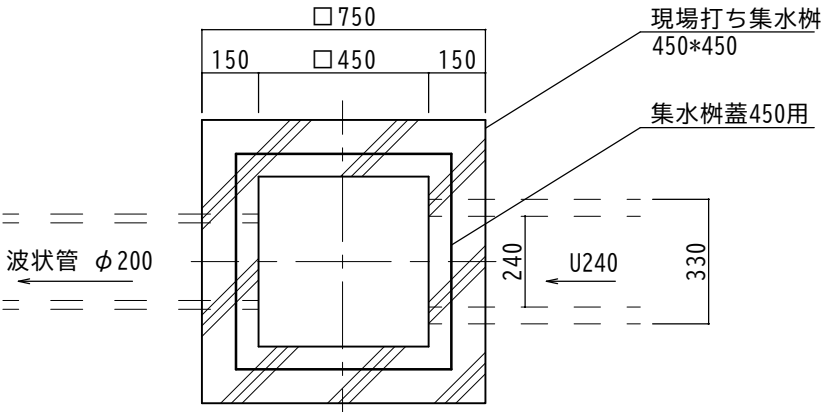

平面図

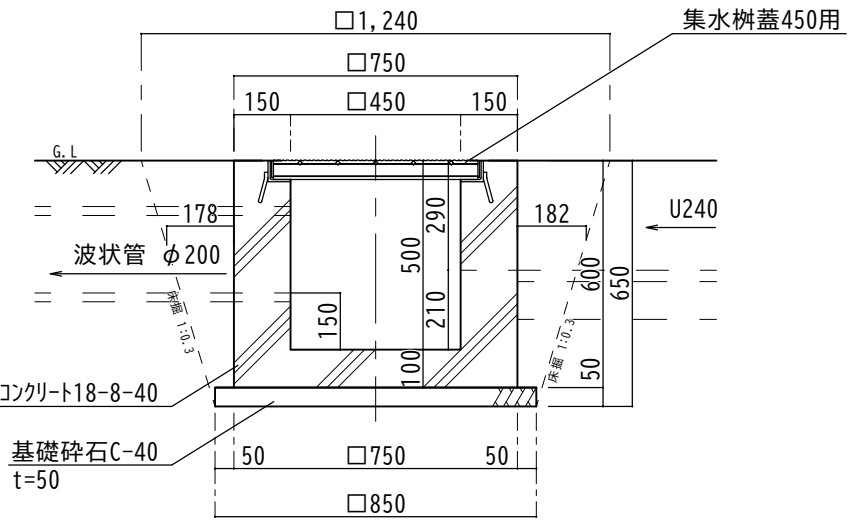


標準断面図

集水樹断面図 S=1/10


A1版を50%縮小

令和5年度			
工事名	史跡銚子山古墳環境整備工事		
図面名	遺構表示工等詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	5 / 13
設 計	(株)空間文化開発機構		
京 丹 後 市			


※施工箇所は周辺の状況に応じて監督員の指示のもと決定すること。

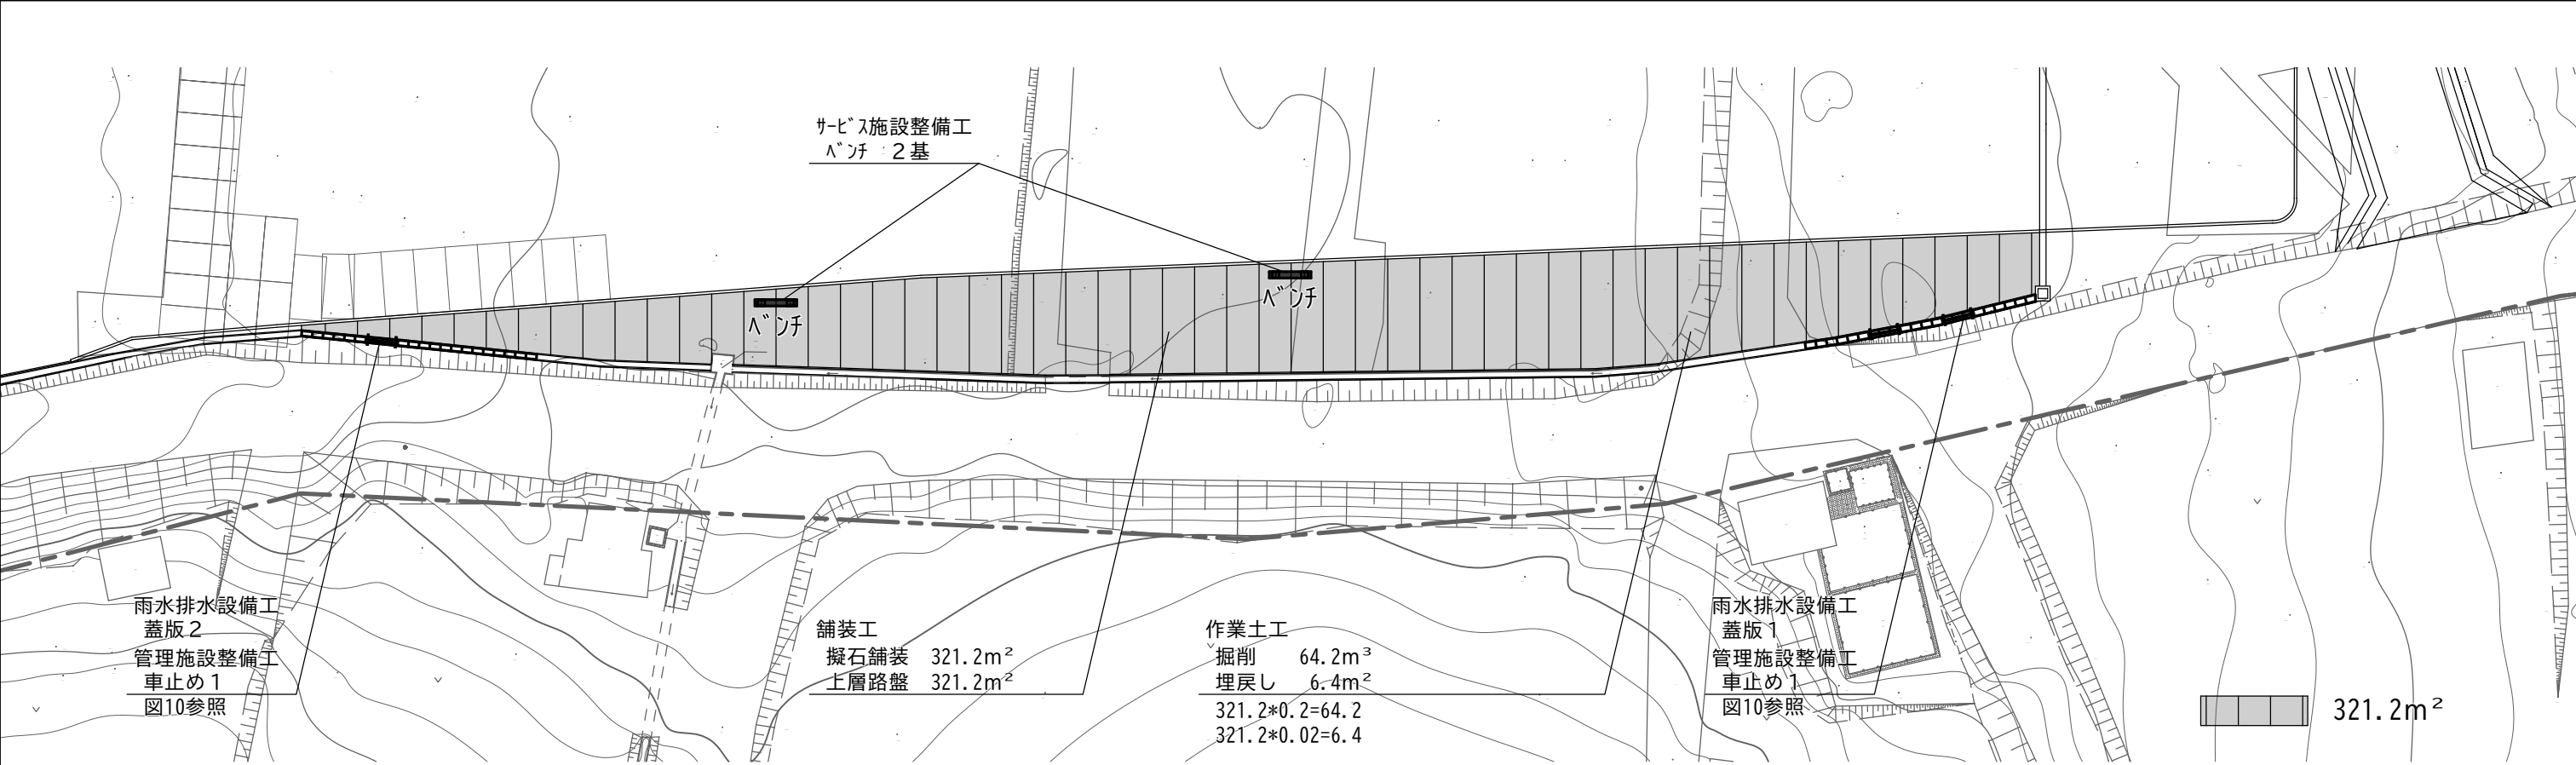

園路広場整備工平面図 S=1/150

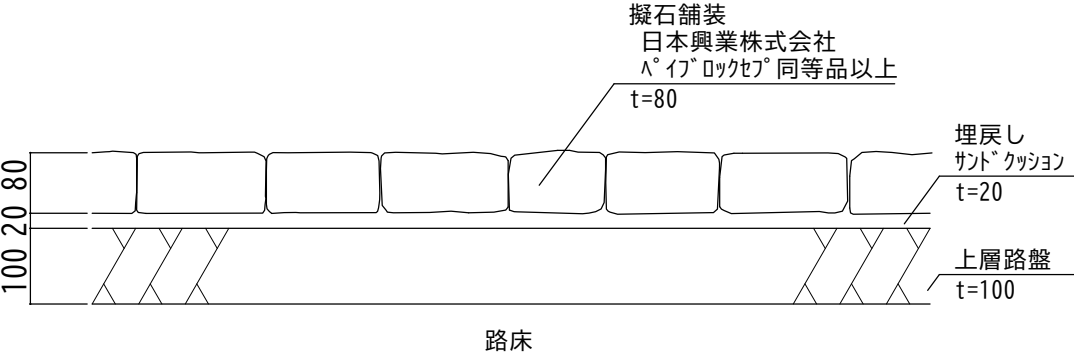

舗装工標準平面図 S=1/5

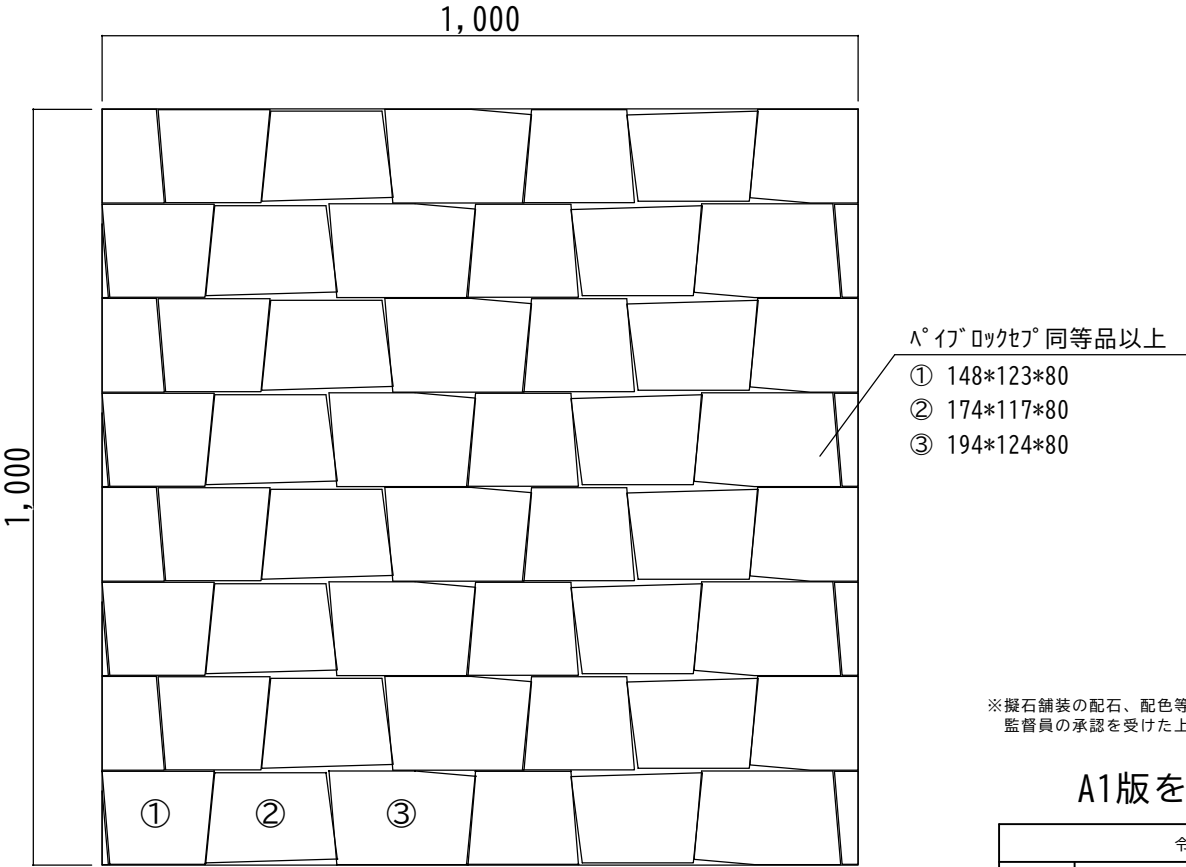


擬石舗装標準平面図 S=1/5

※擬石舗装の配石、配色等については監督員の承認を受けた上で施工すること。


A1版を50%縮小

令和5年度			
工事名	史跡銚子山古墳環境整備工事		
図面名	園路広場整備工詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	7 / 13
設 計	(株)空間文化開発機構		
京 丹 後 市			

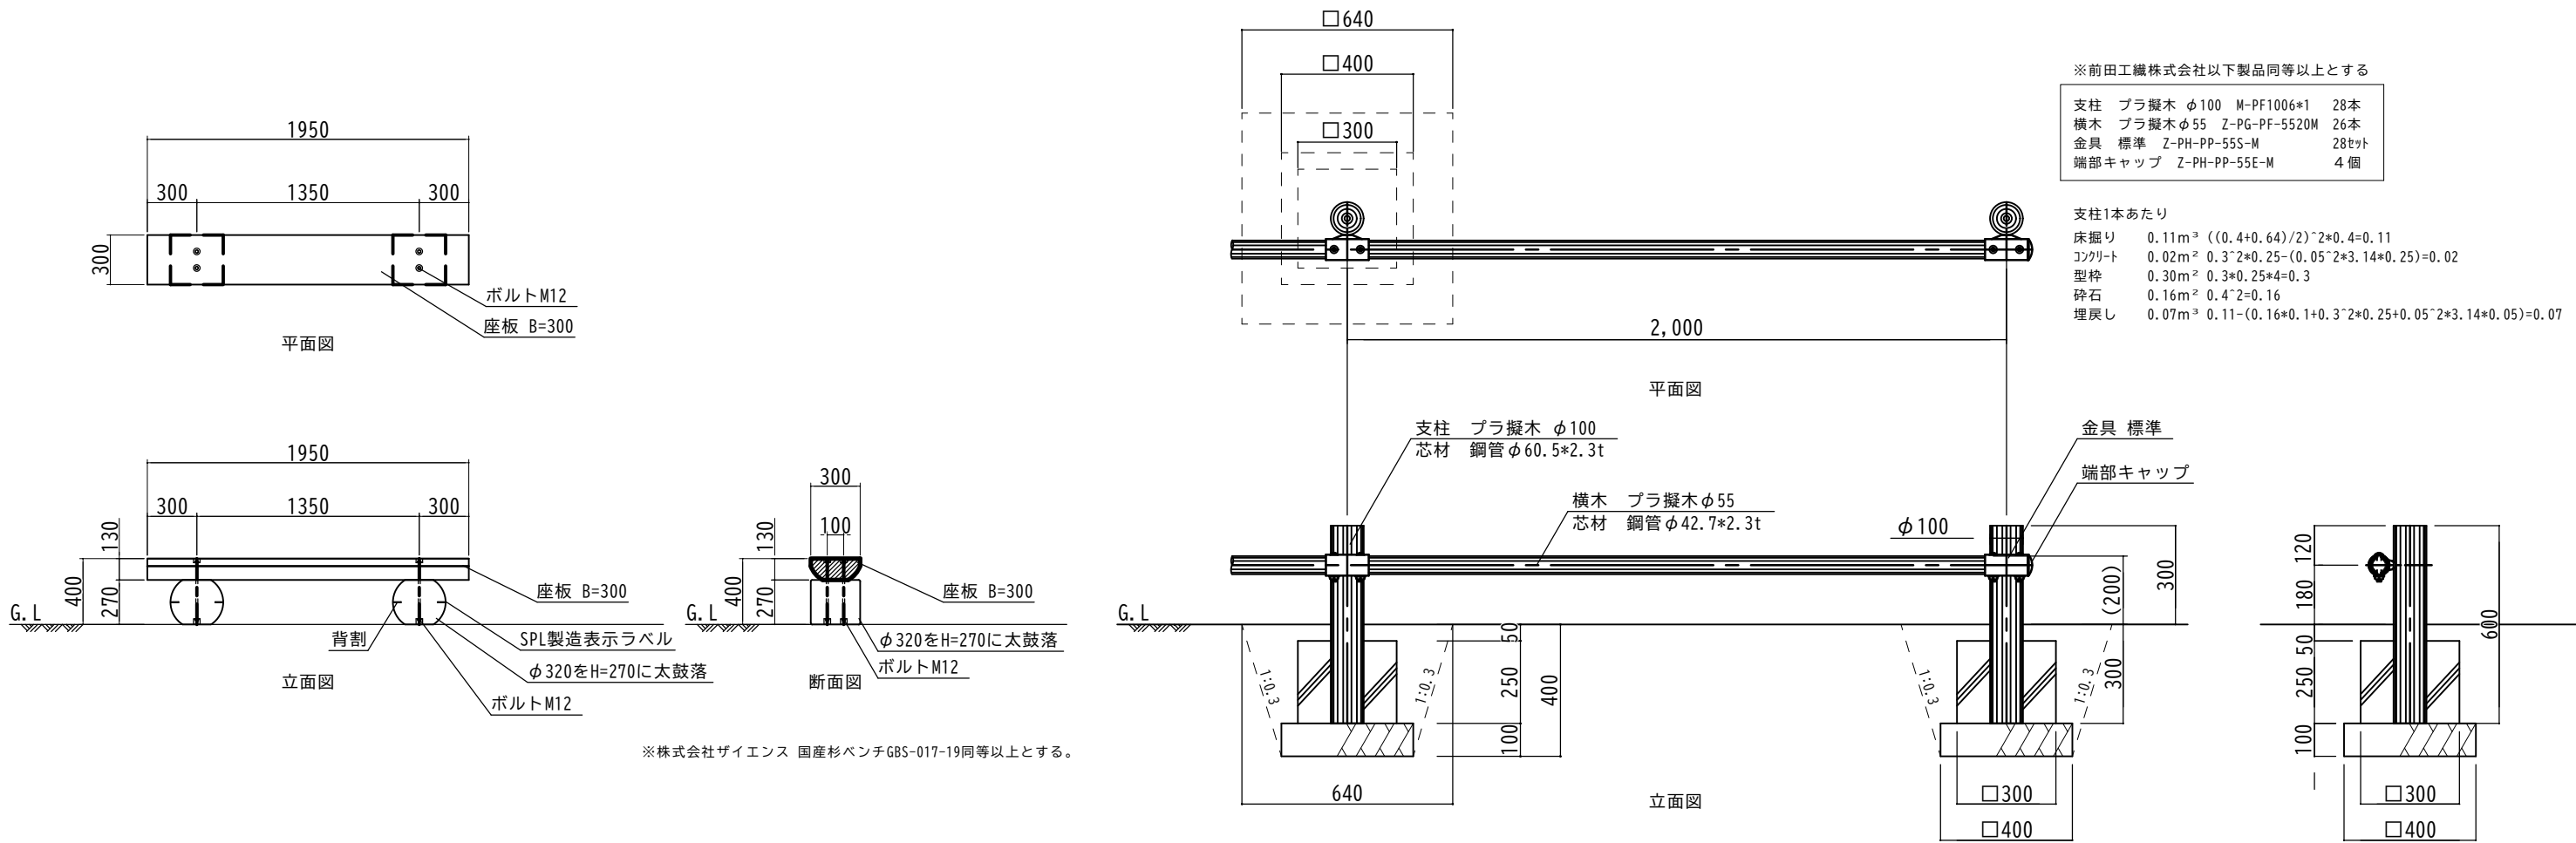


ベンチ詳細図 S=1/20

擬木柵詳細図 S=1/10

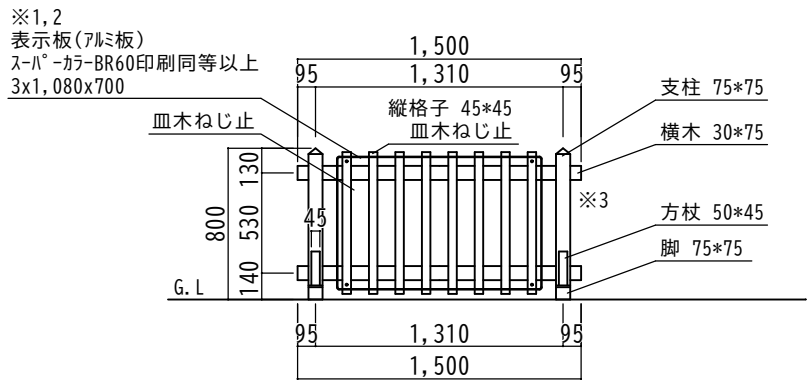


正面図

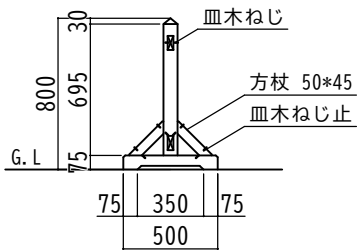


側面図

- ※1 表示板は車止め1にのみ取り付け。
車止め2は本体のみ。
※2 表示板の内容は、簡易地図や写真、文章を
想定したものとする。
※3 株式会社ザイエンス 人止柵
XGCW-001-15A同等品以上とする。

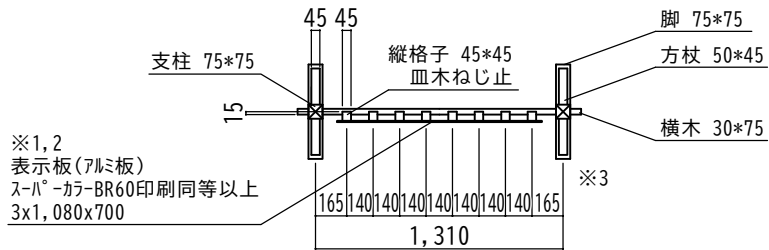

平面図

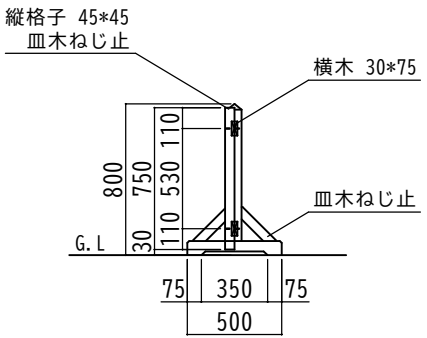

断面図

※各施設の正式な内容、設置位置については
整備委員会で承認を得たうえで決定する。

A1版を50%縮小

令和5年度			
工事名	史跡銚子山古墳環境整備工事		
図面名	サ-ビ-入・管理施設詳細図1		
縮尺	図示	図面番号	8／13
設計	(株)空間文化開発機構		
京丹後市			

車止め1,2詳細図 S=1/20

数量表



記号	工種	種別	細別・規格	単位	数量	備考
☒	公園施設等撤去・移設工					
		伐採工	支障木の伐採 f1-ツツ-伐採(ル-ン併用)			
			幹周30cm以上60cm未満	本	3.0	
			幹周60cm以上90cm未満	本	7.0	
			幹周90cm以上120cm未満	本	9.0	
			幹周120cm以上150cm未満	本	-	
			幹周150cm以上180cm未満	本	-	
			合計	本	19.0	
			作業補助(ル-ン併用)	日	5.0	

記号	工種	種別	細別・規格	単位	数量	備考
✕	公園施設等撤去・移設工					
		伐採工	支障木の伐採 f1-ツツ-伐採			合計(ル-ン併用含む)
			幹周30cm以上60cm未満	本	17.0	20本 3+17
			幹周60cm以上90cm未満	本	8.0	15本 7+8
			幹周90cm以上120cm未満	本	9.0	18本 9+9
			幹周120cm以上150cm未満	本	-	
			幹周150cm以上180cm未満	本	-	
			幹周210cm以上240cm未満	本	-	
			合計	本	34.0	53本
		運搬処理工	木材処分 幹	t	12.4	
			木材処分 枝葉	t	2.5	
			現場発生品・支給品運搬 幹	回	12.4	
			現場発生品・支給品運搬 枝葉	回	2.5	

伐採樹木リスト

番号	樹種名	幹周 (cm)	番号	樹種名	幹周 (cm)	番号	樹種名	幹周 (cm)	番号	樹種名	幹周 (cm)
42	ミズナラ	119.3	568	ミズナラ	94.2	995	エノキ	56.5	1333	エノキ	65.9
130	ミズナラ	119.3	572	タブノキ	119.3	998	タブノキ	122.5	1334	タブノキ	37.7
163	ミズナラ	119.3	584	カラスザンショウ	119.3	1084	タブノキ	125.6	1335	タブノキ	53.4
164	雑木	87.9	597	タブノキ	62.8	1098	タブノキ	103.6	1336	モチノキ	37.7
168	ミズナラ	119.3	657	モチノキ	31.4	1107	モチノキ	75.4	1337	タブノキ	34.5
173	タブノキ	59.7	897	タブノキ	119.3	1108	ミズナラ	72.2	1338	ミズナラ	62.8
174	タブノキ	94.2	967	ミズナラ	59.7	1313	ニセアカシア	50.2	1339	ニセアカシア	44.0
238	タブノキ	116.2	968	モチノキ	78.5	1314	ミズナラ	34.5	1340	タブノキ	119.3
397	ミズナラ	100.5	971	タブノキ	119.3	1327	ミズナラ	87.9	1341	ミズナラ	53.4
449	サクラ	119.3	972	タブノキ	56.3	1328	ウルシ	31.4	1342	ミズナラ	62.8
528	タブノキ	59.7	973	タブノキ	97.3	1329	タブノキ	37.7	1396	ニセアカシア	37.7
541	モチノキ	81.6	976	モチノキ	62.8	1330	ウルシ	34.5			
542	ミズナラ	56.5	987	エノキ	69.1	1331	タブノキ	53.4			
551	モチノキ	75.4	994	エノキ	84.8	1332	エノキ	81.6			


☐ 人力・機械併用

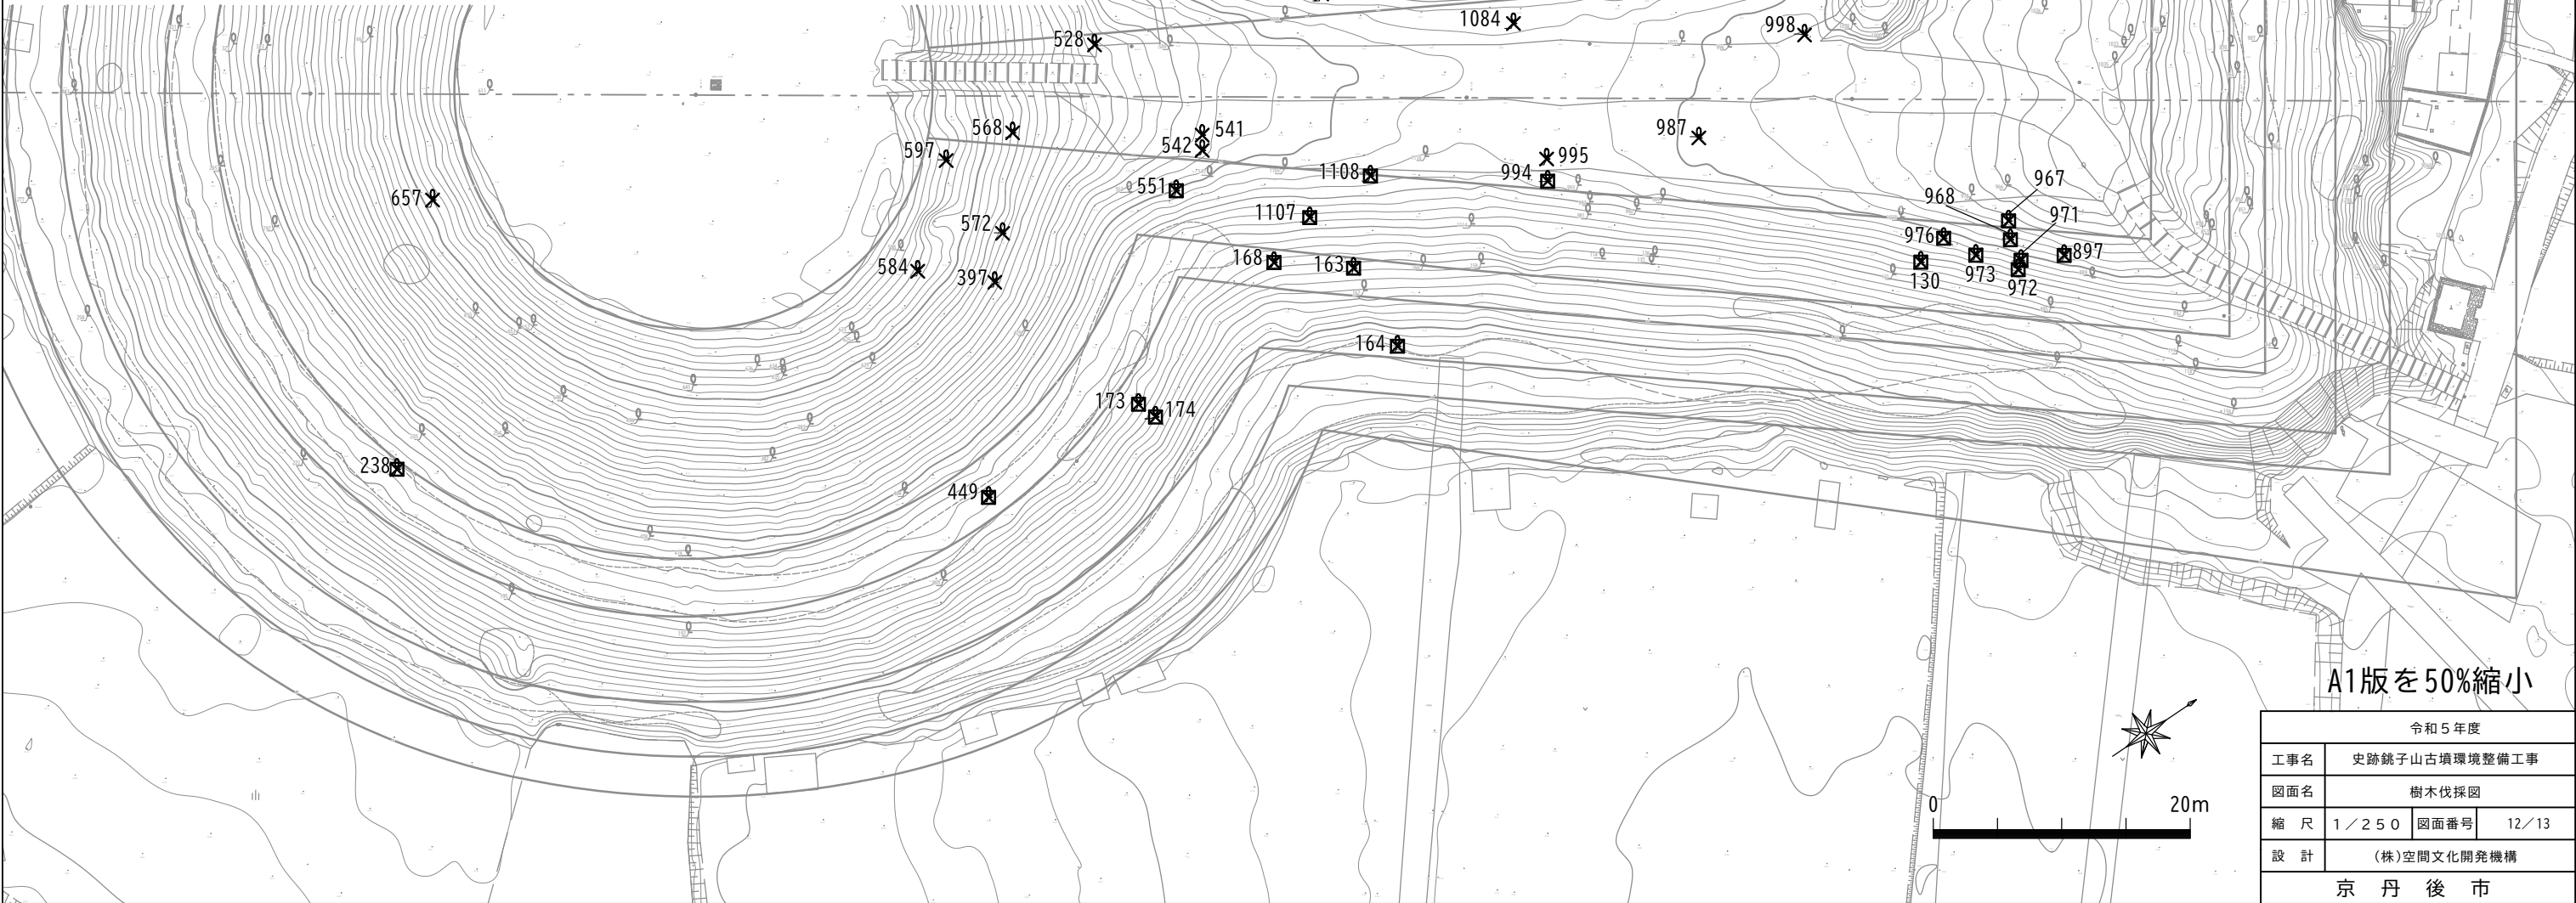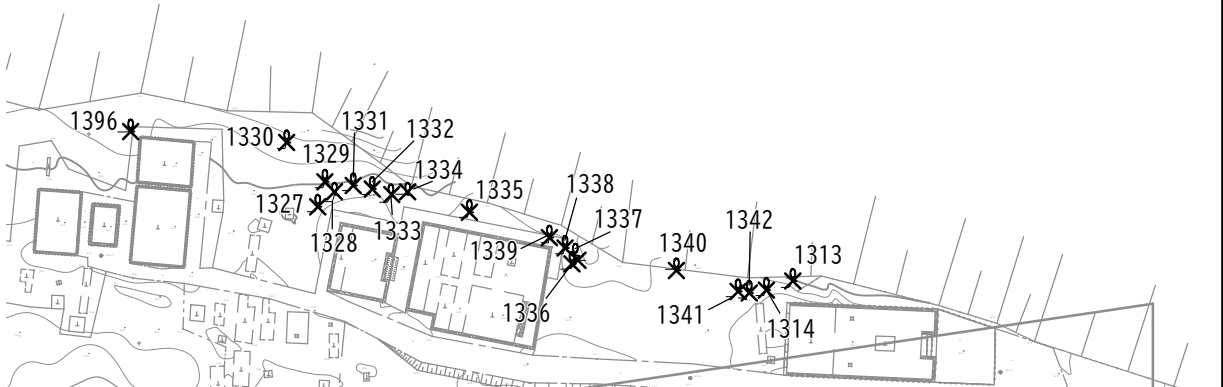


2. 令和6年度網野銚子山古墳整備予定

(1) 整備概要


令和6年度は、国庫補助事業にて遺構及び埴輪復元等整備、公開活用に向けた便益施設や管理施設等の整備を予定している。

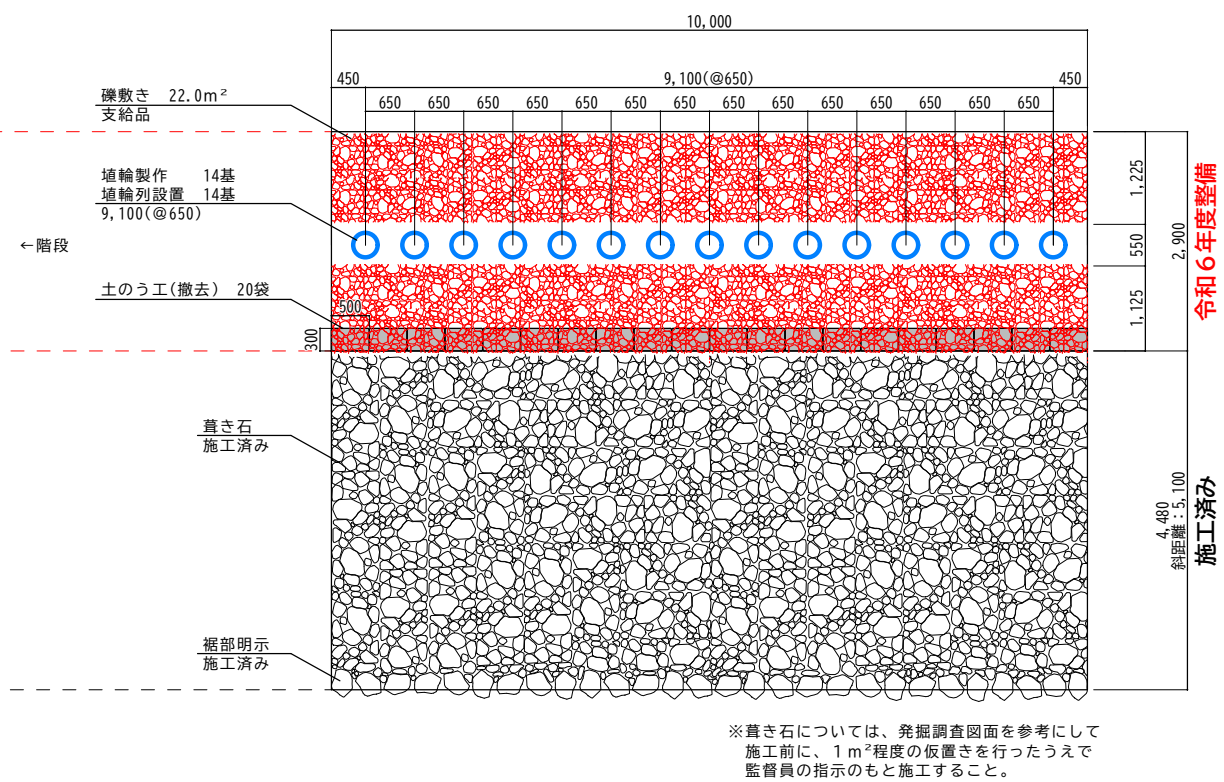


遺構復元工平面図 S=1/100

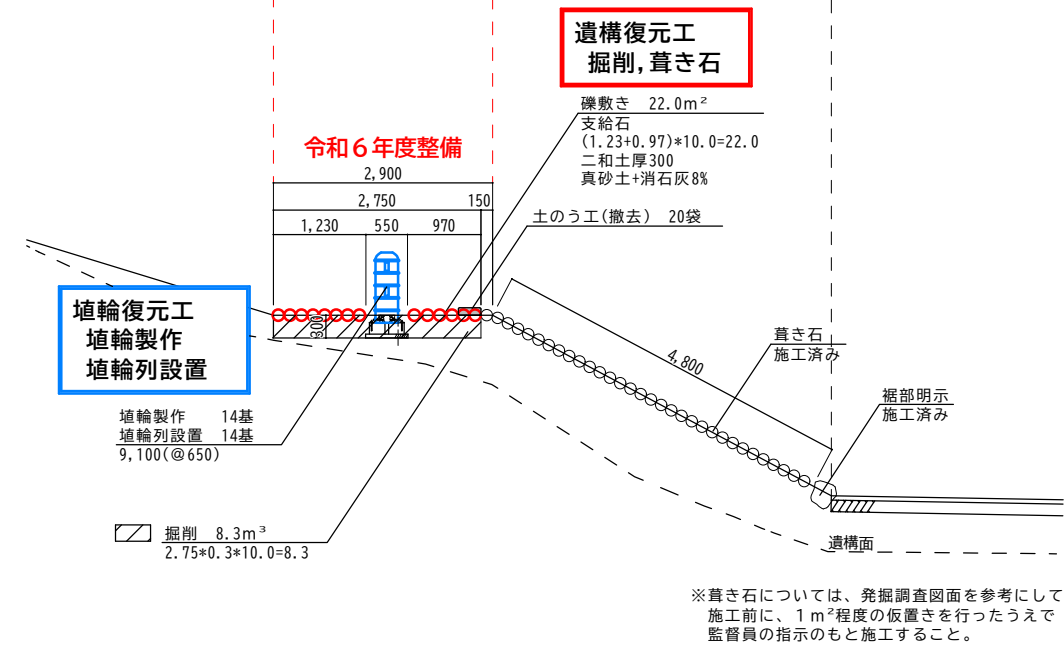


遺構復元工標準断面図 S=1/100

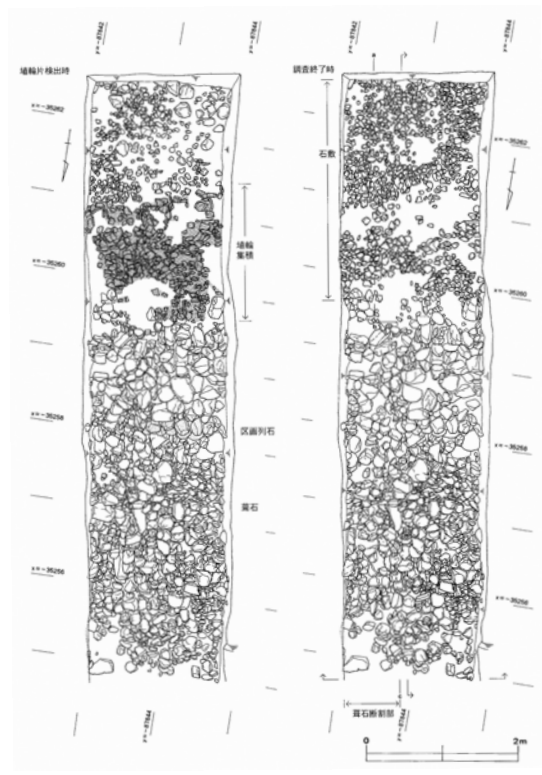

トレンチ遺構図 S=1/100

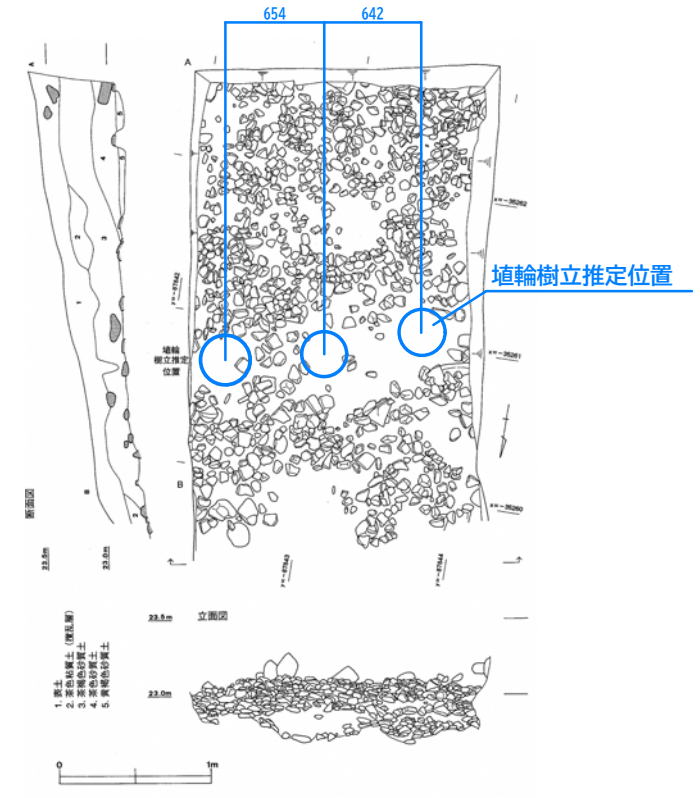

トレンチ遺構拡大図 S=1/50

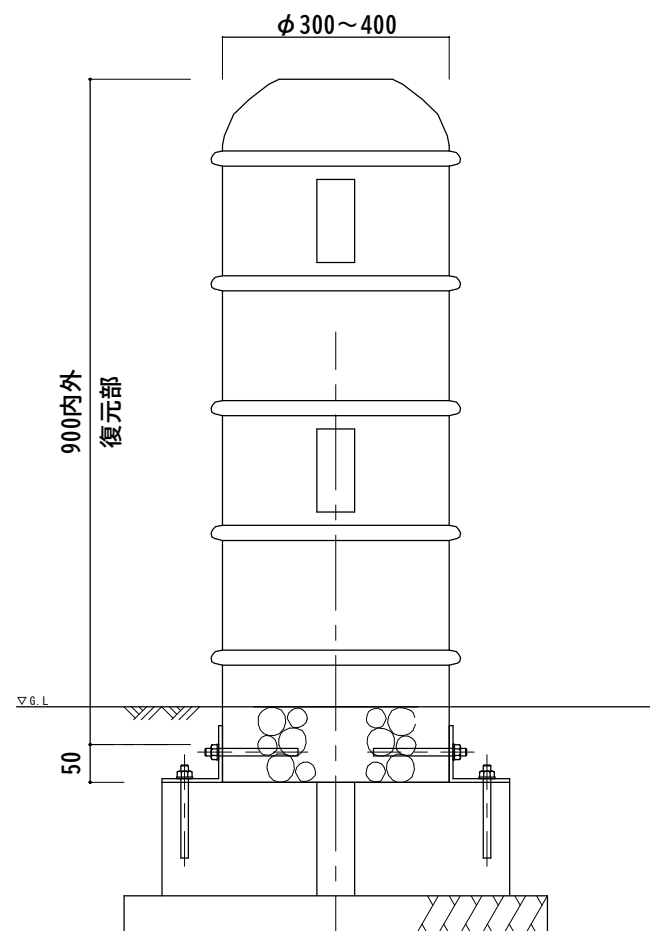


丹後型円筒埴輪製作詳細図 S=1/10



丹後型円筒埴輪実測図 S=1/10



丹後型円筒埴輪写真

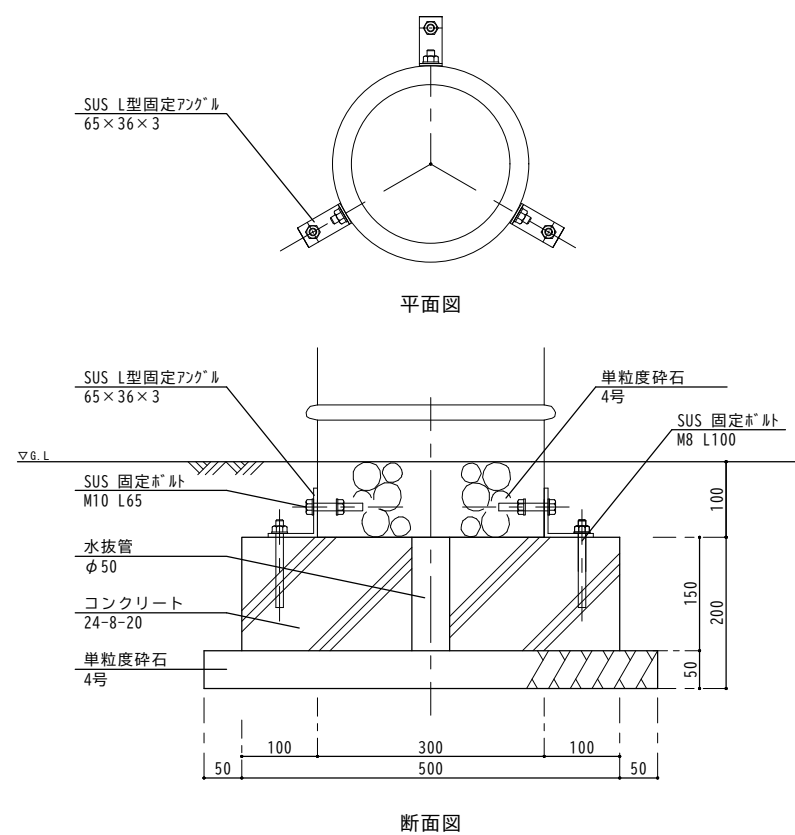

埴輪据付基礎標準図 S=1/10



円筒埴輪



盾持埴輪



衣笠埴輪

埴輪製作事例写真(岡山県 千足古墳)

金属製



史跡高麗寺跡（京都府大山崎町）

木製



金沢城（石川県金沢市）

擬木製



カタログ

石製



史跡志波城跡（岩手県盛岡市）



屋嶋城（香川県高松市）



史跡鬼城山（岡山県岡山市）



史跡鬼城山（岡山県岡山市）



大山崎瓦窯跡（京都府大山崎町）



屋嶋城（香川県高松市）



山ノ神遺跡（奈良県桜井市）



特別史跡讃岐国分寺跡（香川県高松市）



史跡赤土山古墳（奈良県天理市）



特別史跡五稜郭跡（北海道函館市）



史跡備中松山城跡（岡山県高梁市）




東大寺（奈良県奈良市）




亀塚古墳〔史跡大岩山古墳群〕（滋賀県野洲市）

＜各種サインの比較表＞


	金属製	木製	擬木製	石製
景観	○	◎	△	○
耐久性 ※架台のみ	○	×	○	◎
導入コスト	○	◎	△	△
施工性	◎	○	○	△

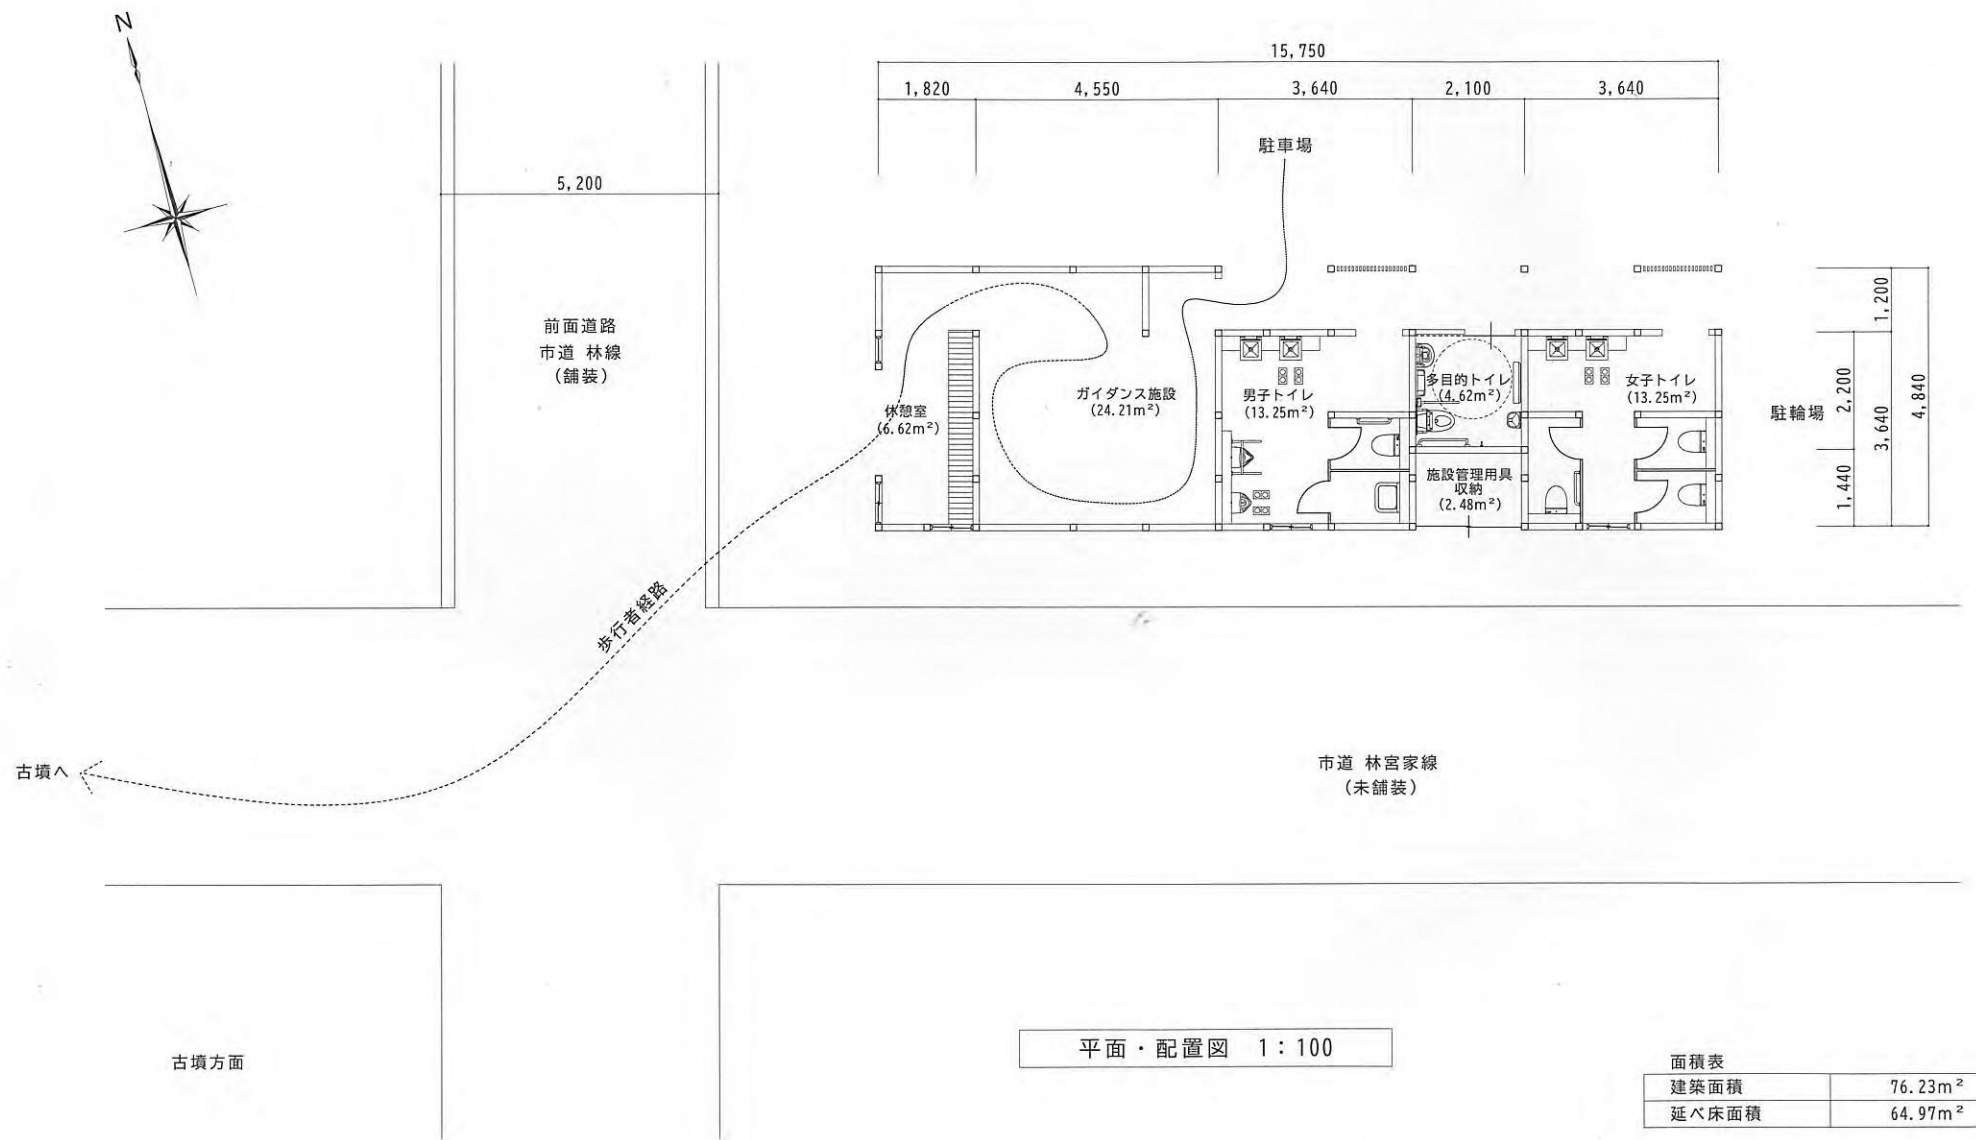

Type-A案




東立面図 1:100

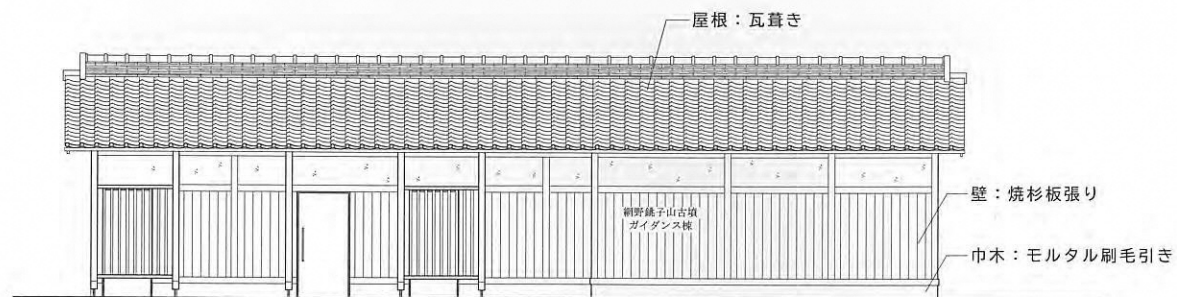


北立面図 1:100

Type-B案




東立面図 1:100

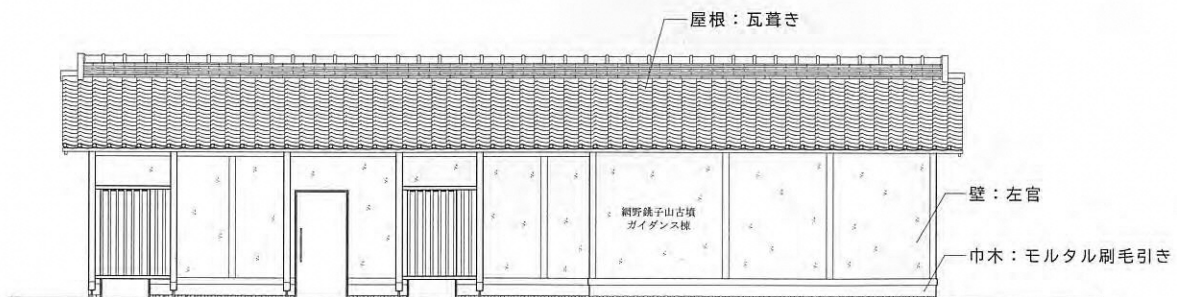


北立面図 1:100

Type-C案



東立面図 1:100

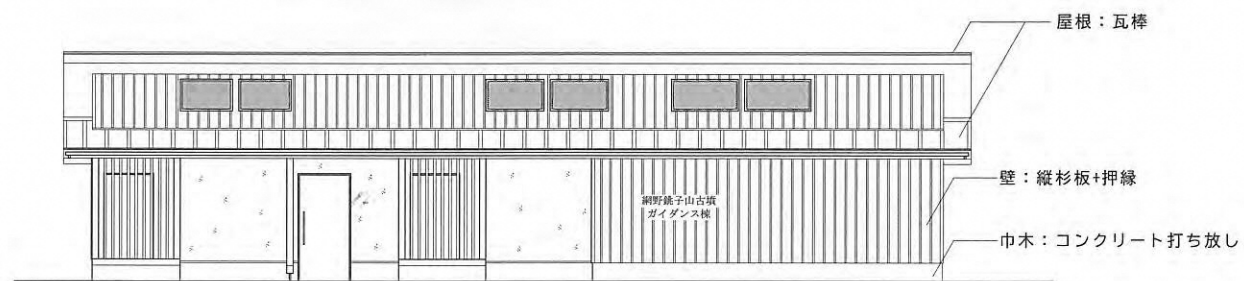

北立面図 1:100
