


【資料】

●今後のスケジュール

整備関連
人材育成
広報関連
イベント
網野銚子山プロジェクト

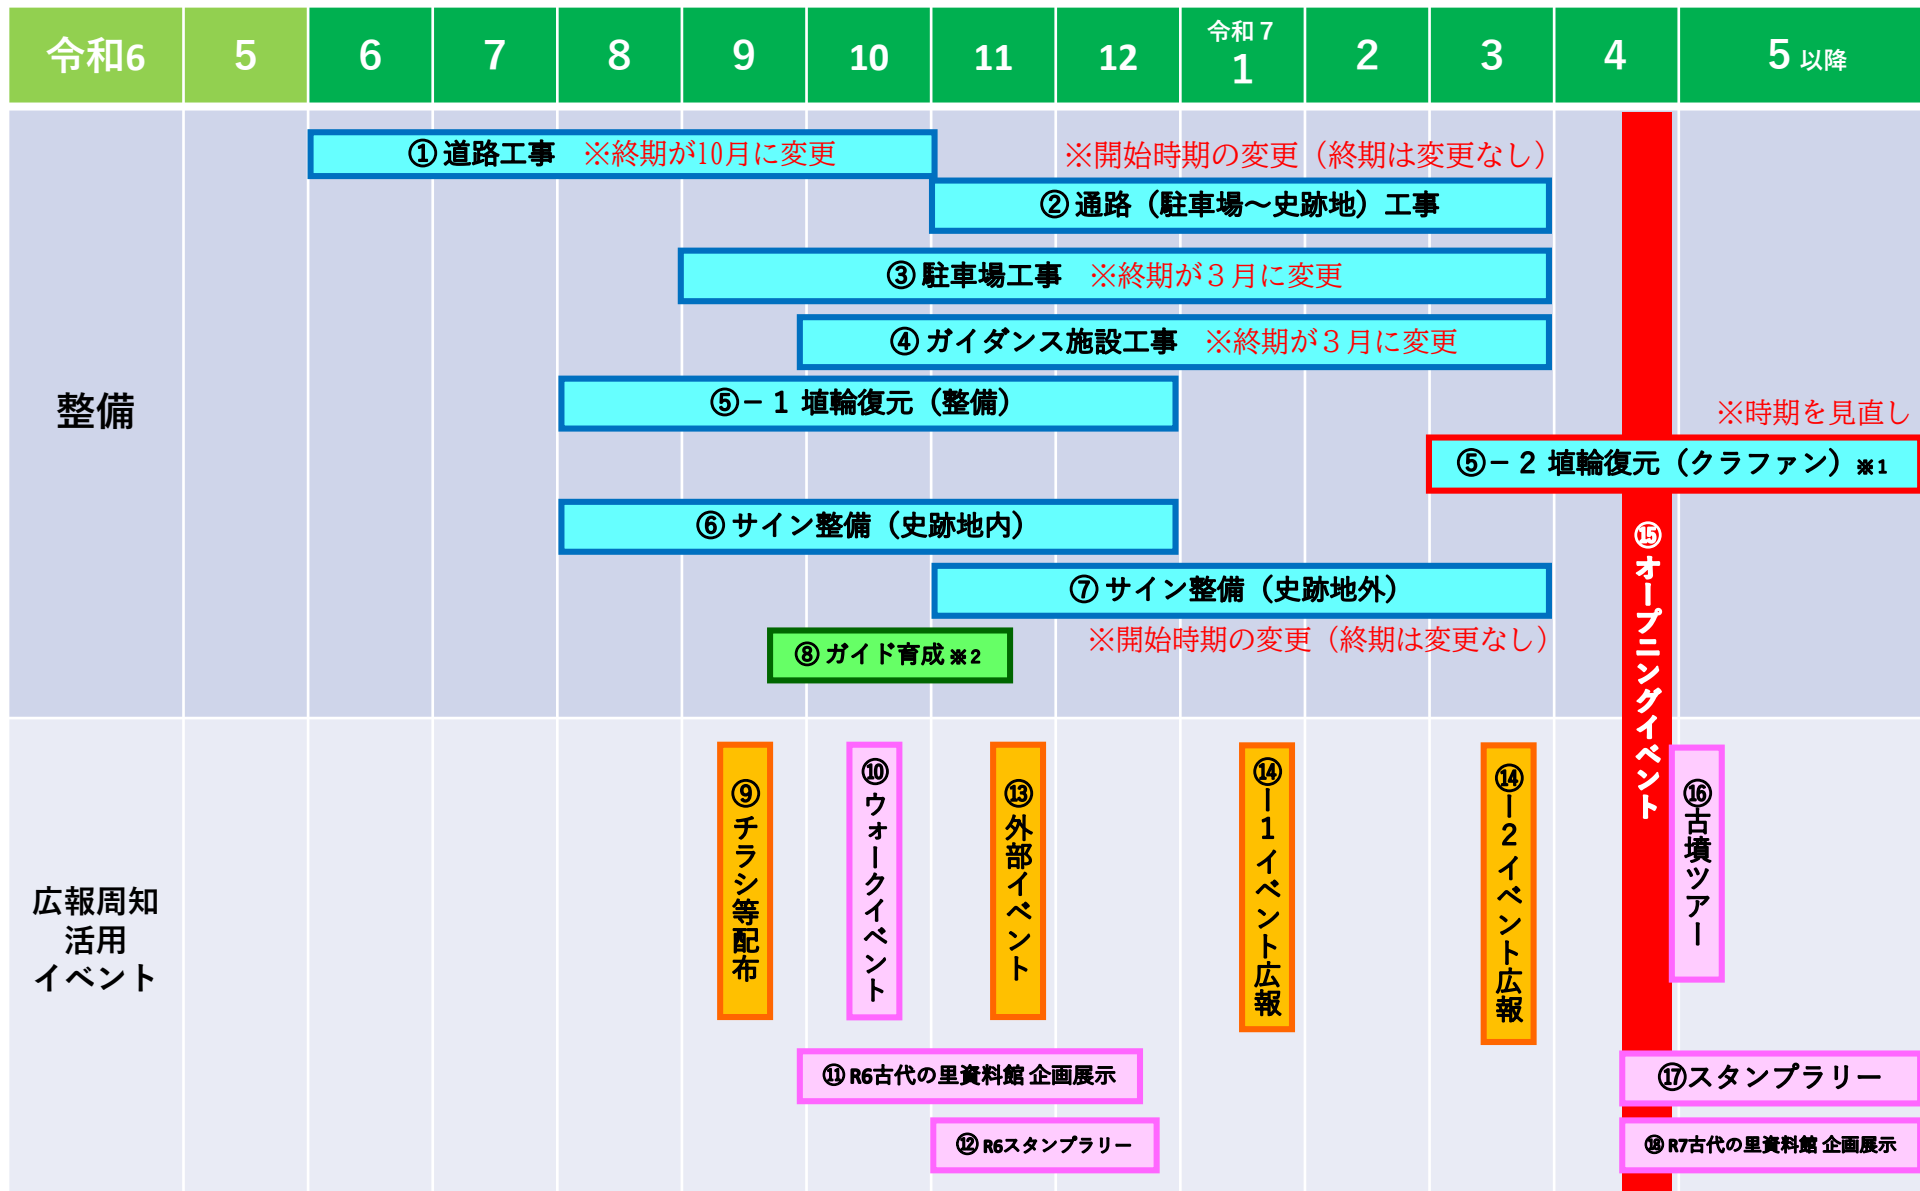

映像資料作成・ライトアップは、費用対効果、環境影響を考慮した結果、実施しない事とした。
 ※1 網野銚子山プロジェクトはR8まで継続予定
 ※2 ガイド育成は以後継続的に実施予定

① R6 道路工事（市道林線及び大將軍線 舗装工事）

【施工期間】～令和6年10月（予定）※終期が10月に変更

【内容】駐車場用地までの舗装工事

② R6 通路工事（市道林宮家線・寛平法皇線 舗装工事）

【施工期間】～令和7年3月下旬（予定）※開始時期の変更（終期は変更なし）

【内容】駐車場用地から史跡地までの舗装工事。既に付替え済の市道銚子山線まで接続。



③ R6 駐車場工事

※終期が3月に変更

【施工期間】～令和7年3月下旬（予定）

【内容】駐車場内に横断歩道を設置するよう変更。

大型バス：4台 普通自動車：24台
車椅子対応：2台 二輪車：7台

④ R6 ガイダンス施設工事

【施工期間】～令和7年3月下旬（予定）※終期が3月に変更

【内容】トイレ便器・手洗場の数、浄化槽の規模、ガイダンス部分の扉の仕様を変更。

男女トイレ、ユニバーサルトイレ各1設置
休憩用ベンチはガイダンス施設内外に設置。
ガイダンス施設内の解説パネルは網野銚子山古墳の詳細な解説・周辺史跡との関連も示す。



⑤-1 R6 埴輪復元（整備）

【施工期間】～令和6年12月下旬（予定）

【内容】葺石復元上部に15基のFRP製 復元埴輪を設置。※2種製作予定を1種に変更

⑤-2 R6 埴輪復元（ガバメント・クラウドファンディング）

網野銚子山プロジェクト

【CF実施期間】令和7年3月～令和7年5月（予定）※時期を見直し

【施工期間】令和7年6月～令和8年3月下旬（予定）※時期を見直し

【内容】⑤-1の復元埴輪に加え、ガバメント・クラウドファンディングを活用し、民間から寄付を募り復元埴輪を設置する。

当初目標は100本。設置位置は⑤-1に連なる1段目テラス。

復元埴輪は1基55万円＋施工費

単価的に1人1基は難しいので、人数割りの最低金額の設定が必要。1口20,000円から複数プランを設定予定。

⑥ R6 サイン整備（史跡地内）

【施工期間】～令和6年12月下旬（予定）※開始時期の変更（終期は変更なし）

【内容】史跡内現地に説明板5ヶ所（4頁②～⑥）、誘導サイン2か所（4頁③～④）を設置。

⑦ R6 サイン整備（史跡地外）

【施工期間】～令和7年3月下旬（予定）

※2基取替から2基撤去に変更

【内容】駐車場への誘導サイン2か所新設（7頁④・⑤）、既存サイン（本覚寺傍）2か所（7頁②・③）撤去。

● 駐車場・ガイダンス施設

【駐車スペース】


大型バス：4台

普通自動車：24台

車椅子対応：2台


二輪車：7台

- ・ トイレの基数を【男】小2大1、【女】2に変更。
- ・ 手洗い場数を1つに変更。
- ・ 浄化槽のサイズ変更。
- ・ ガイダンス施設出入口を1に変更。
- ・ ガイダンス施設内の解説駐車場内に横断歩道を設置するよう変更。
- ・ 通路施工一部に復元に使用した葺石の残りを使用予定。
- ・ ガイダンス施設から史跡側出入口まで点字ブロック敷設。
- ・ 休憩用ベンチは、史跡に向けて設置するとともに、室内にも椅子を設置予定。

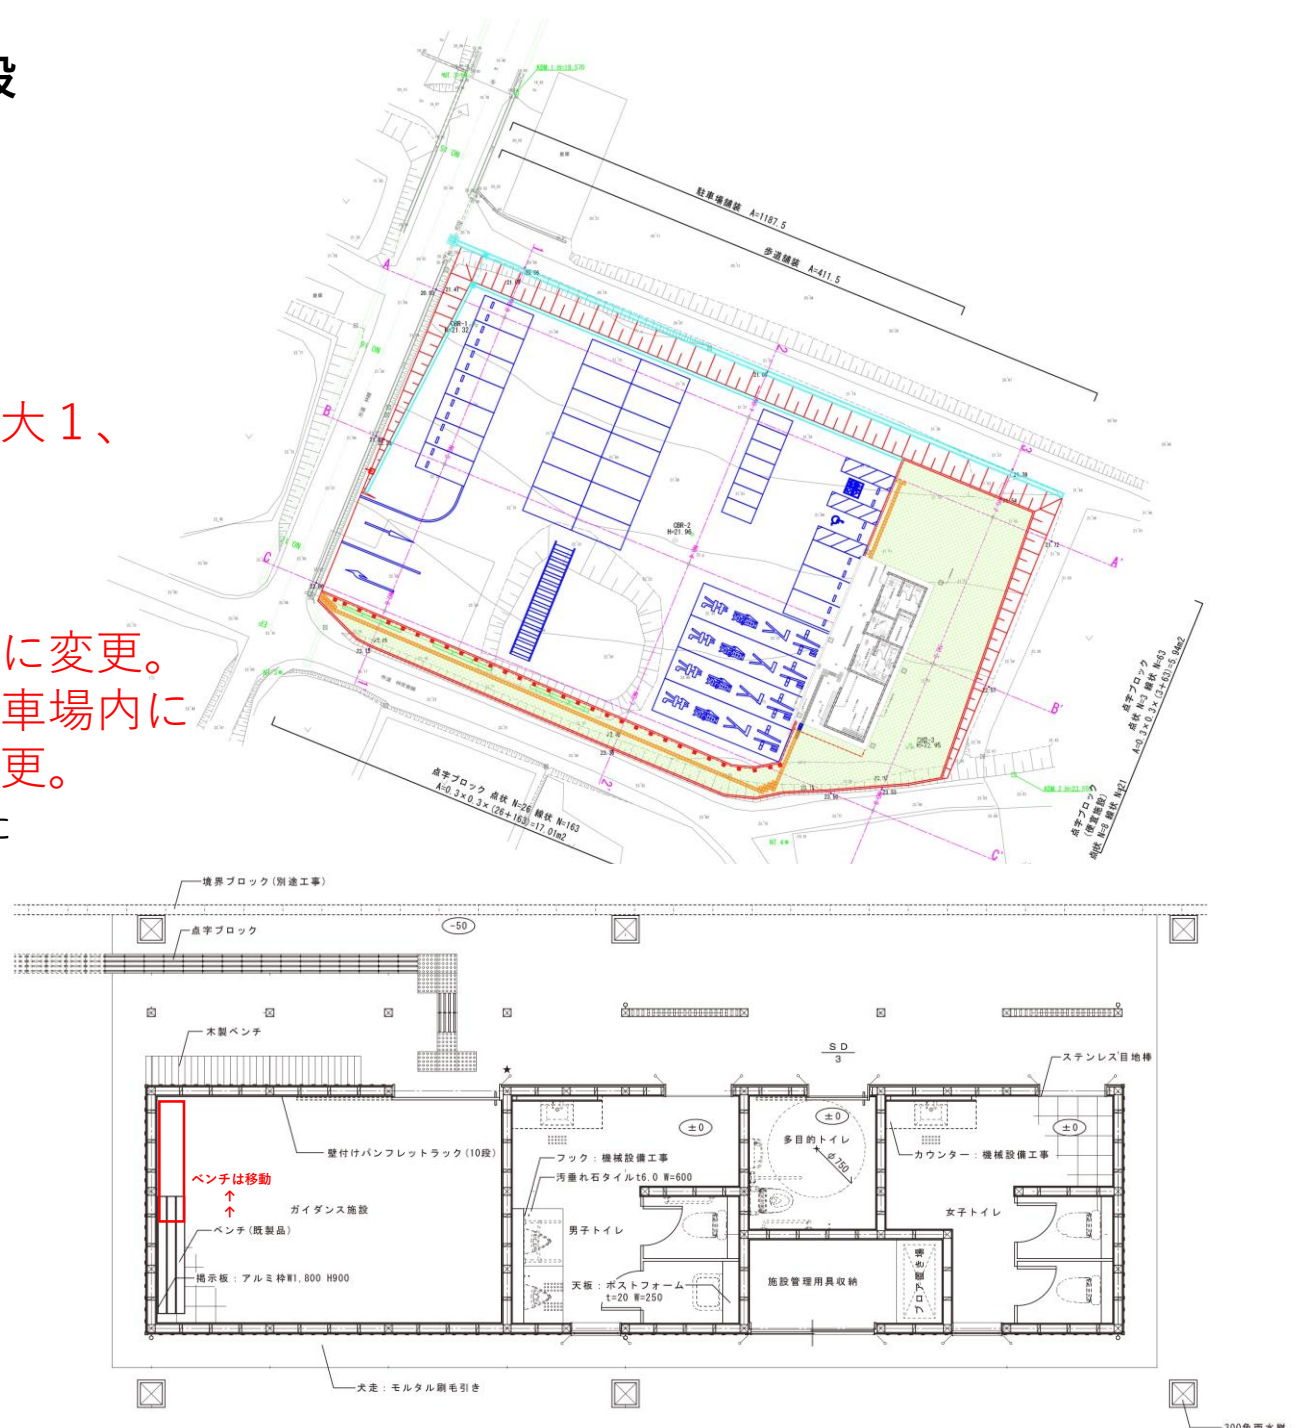


●埴輪・礫敷復元


埴輪 15基、礫敷26.4m²。配置は発掘調査の成果に基づき設置。

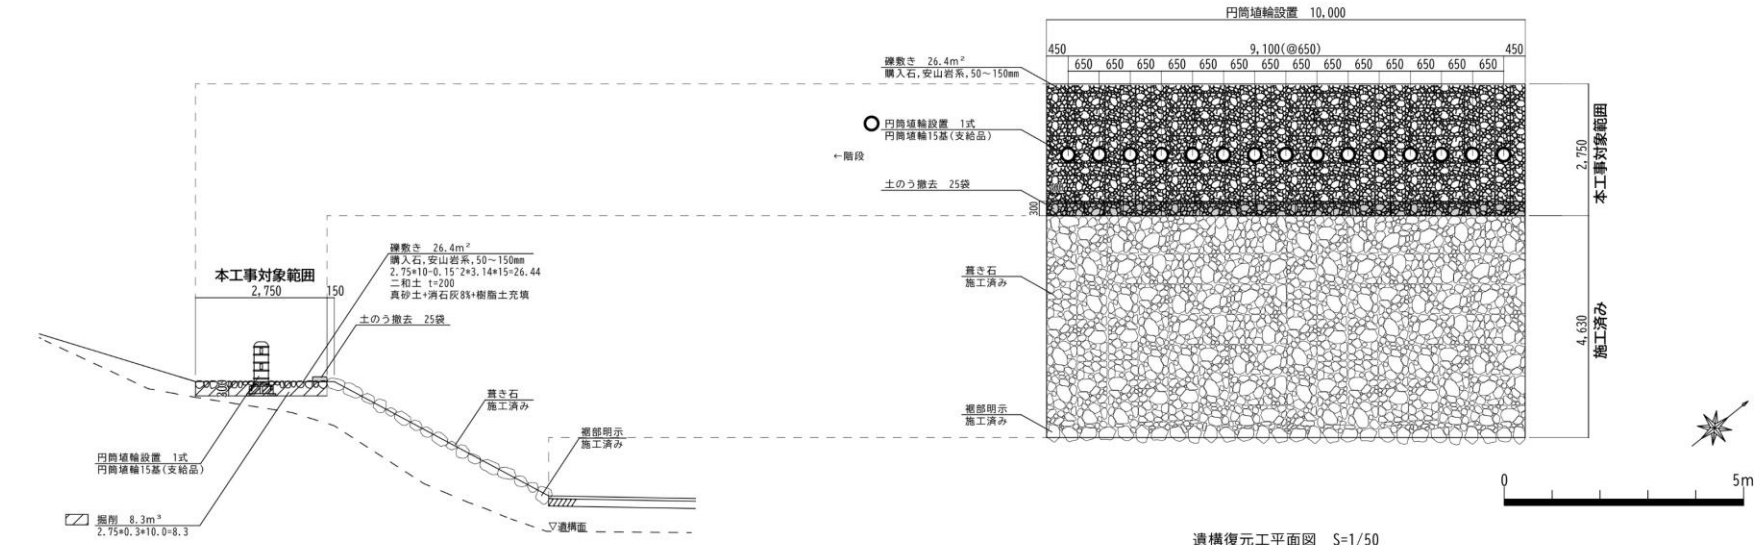

遺構復元工平面図 S=1/50

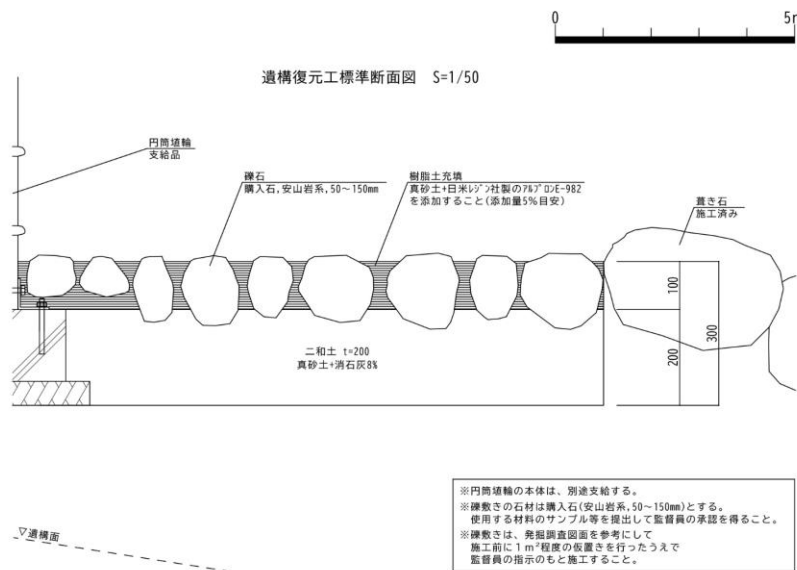


礫敷き標準断面図 S=1/5

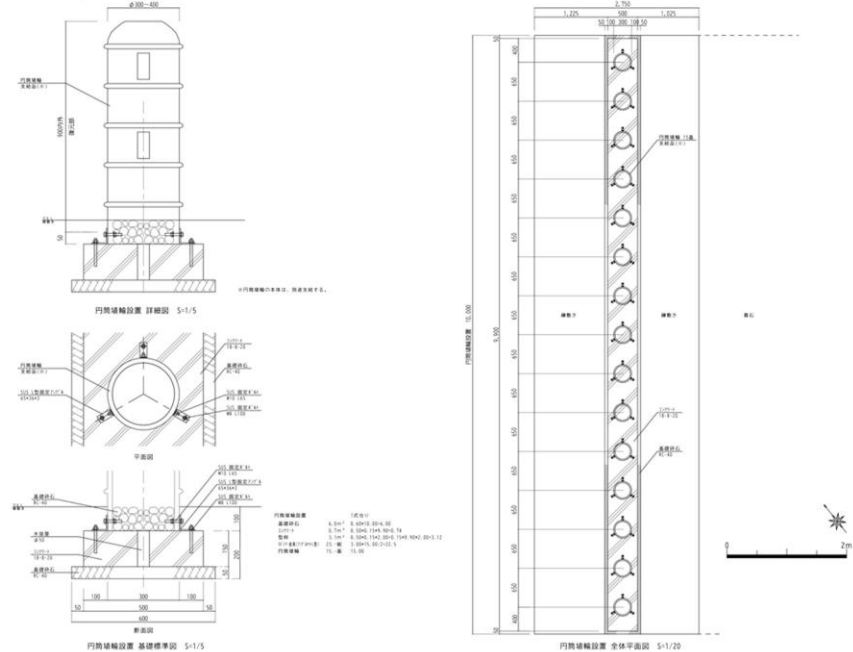

●史跡外誘導サイン案（集約版）

→：誘導ルート
 ②～⑤：前回掲出案
 ×：取り止め・撤去

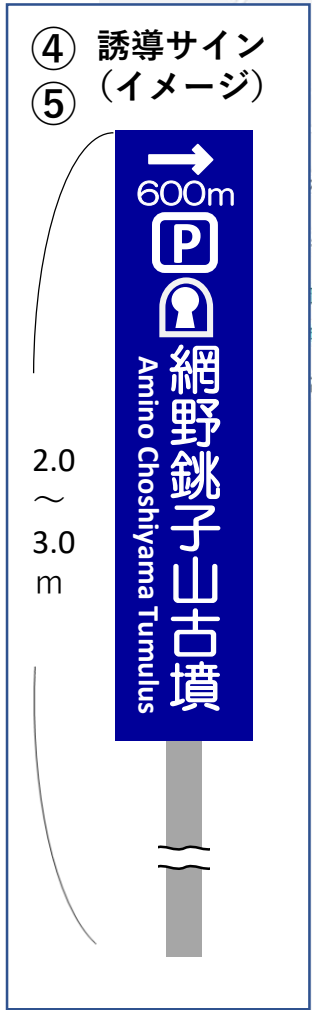

前回委員会の意見を踏まえ、誘導ルートを1つに集約。
 ②③の位置にある既存看板は老朽化と企図しないルートへの誘導をさけるため撤去の予定。

■史跡外誘導サイン仕様
 ④両面・⑤片面、1本脚式
 地 色：濃青
 文字色：白
 高 さ：2.0～3.0m（現場の状況に合わせる）
 テキスト：名称（英語）、方向指示、
 距離④600m・⑤500m、ピクトグラム

⑧ R6ガイド育成

【イベント名】 京丹後の歴史文化を学ぶ

【実施期間】 令和6年9月～11月上旬（予定）

【対象】 網野銚子山古墳周辺のガイドを検討している個人、団体

【内容】 隔週、全4回の集中講座で、ガイドに役立つ知識を習得してもらう。

事前申し込み制、参加無料。

「⑩現地見学会」「⑪古代の里企画展示のギャラリートーク」も講座の一環とする。

広報9月号にて告知予定。告知にあわせて市内ガイド団体などに参加の呼びかけを行う。

可能な人にはOPイベントの日にも参加を依頼予定。

【開催日程】

※市内ガイド団体などには出前講座などを活用した「補講」を実施しサポートすることも検討

開催日	時間	テーマ	集合場所	備考
令和6年 9月29日（日）	13:00～ （約90分）	丹後地域の古墳について	網野保健センター2階 集団指導室	
令和6年 10月12日（土）	13:00～ （約60分）	網野銚子山古墳について	丹後古代の里資料館	「丹後古代の里資料館秋季企画展」の ギャラリートークを兼ねた開催（入館料無料）
令和6年 10月26日（土）	13:00～ （約120分）	網野の古墳を歩く	京丹後市役所 網野庁舎（ら・ぽーと） 前駐車場	網野銚子山古墳と離湖周辺の古墳を巡る ウォークイベントを兼ねた開催
令和6年 11月9日（土）	13:00～ （約90分）	網野銚子山古墳現地見学	京丹後市役所 網野庁舎（ら・ぽーと） 前駐車場	

⑨ R6 告知チラシ・ポスター配布

【実施時期】 令和6年9月下旬ごろ（予定）

【内容】 史跡情報・オープン日時・関連イベント（⑩現地見学会・⑪企画展・⑫R6スタンプラリー）情報の告知。
10～12月のイベントでも配布できる内容にする。

⑩ R6 ウォークイベント（名称：「網野の古墳を歩く（仮）」）

【開催日】 令和6年10月26日（土）（予定）

【内容】 網野銚子山古墳と周辺古墳を巡るウォークイベント。
集合場所・駐車場：網野庁舎、13時集合・16時解散予定
網野銚子山古墳～復元岡1号墳～離湖古墳・離山古墳（往復約5キロ）
⑧ガイド育成の講座にも位置付け。

⑪ R6 古代の里資料館 企画展示

【実施時期】 令和6年10月12日（土）～12月22日（日）（予定）

【内容】 網野銚子山古墳の発掘成果報告など。来年度のオープンに向けての周知と、⑧ガイド育成、
⑩ウォークイベント、⑬外部イベント参加と連動して各企画の盛り上げに繋げるため、
会期を12月下旬までに設定。
⑧ガイド育成と連動する「ギャラリートーク」を開催初日（10月12日（土））に実施。

⑫ R6 スタンプラリー

【開催日】 令和6年11月1日（金）～12月22日（日）（予定）

【内容】 「京丹後歴史文化めぐりマップ」の機能を活用したスタンプラリーを開催。⑰R7スタンプラリーの
運用試験も兼ねる。チェックポイントに⑪企画展を開催している古代の里資料館を含める事、完走
者に記念品（網野銚子山古墳のご墳印）を授与する事で、来年度のオープニングイベントの周知活
動に繋げる。
ご墳印は網野銚子山古墳の墳丘復元図と丹後型円筒埴輪のシルエットを台紙に印字したものに丹後
緑風高校書道部の部員による揮毫を予定。

⑬ R6 外部イベント参加

【開催日】 令和6年11月24日（日）ほか

【内容】 網野銚子山古墳史跡整備とオープニングイベントの告知を中心に市内史跡のPRを行う。
オープニングイベントへの誘客・出店誘致、古墳ツアーの宣伝、出店自治体とのコネクション作りを目標とする。
主たるターゲットを京丹後市に来訪可能な近隣府県に設定し
●はにコット（11/24 高槻市）
●古墳サミット（日時未定 堺市）
に参加を予定。

◆参考情報

イベント名：古墳フェスはにコット
開催日時：2024年11月24日（日）10:00～16:00（入場無料）
会場：今城塚古墳公園（大阪府高槻市）
主催：古墳フェスはにコット実行委員会
概要：古墳・埴輪・古代がテーマのアートの祭典
出店者数：展示販売100店舗 飲食35店舗
行政PRブース18市区町村
ステージ出演30組（2023実績）
動員数：35,000人（2023実績）



⑭ R7 オープニングイベント広報

【実施時期】 1, 令和7年1月中旬（予定）
2, 令和7年3月下旬（予定）

【内容】 オープニングイベントに関する広報
1にHP／めぐりマップ／イベントバンク／報道投げ込み
2にHP／めぐりマップ／イベントバンク更新、久美浜有線放送／LINE／（記者発表）

⑮ R7網野銚子山古墳 オープニングイベント

【実施日】 令和7年4月26日（土） 11：00～15：00

【概要】 史跡整備の完了を周知し、観光誘致を行うとともに、活用事例としてデモイベントを実施する。

⑯古墳ツアー、⑰R7スタンプラリー、⑱古代の里企画展と連動させ賑わい・話題作りを図る。

出店者は市内事業者を主としつつ、⑬外部イベントの出店者の誘致も目指す。

また、並行して古墳に関連した商品の開発を打診していく。

【内容】

- ・ 完成披露式典
- ・ 史跡活用デモイベント（飲食・物販など）
- ・ 地域ガイド団体によるガイド（要費用確認と整理）
- ・ 史跡の特別解説（新旧発掘担当者のエピソードトークを交えたものなど）
- ・ 地元小中学生等によるなにか（検討中）

【スケジュール】 ※開催日時を4/26（土） 11：00で想定

●4/25（金）

13：00～17：00 前日設営

※墨だし・テント設営・機材搬入など

●4/26（土）

9：00 当日設営（出店者準備）


11：00 式典開始 ※式典終了後、販売ブース開始を想定

13：00 特別説明会

15：00 閉会

17：00 完全撤収

【OPイベントイメージ図】

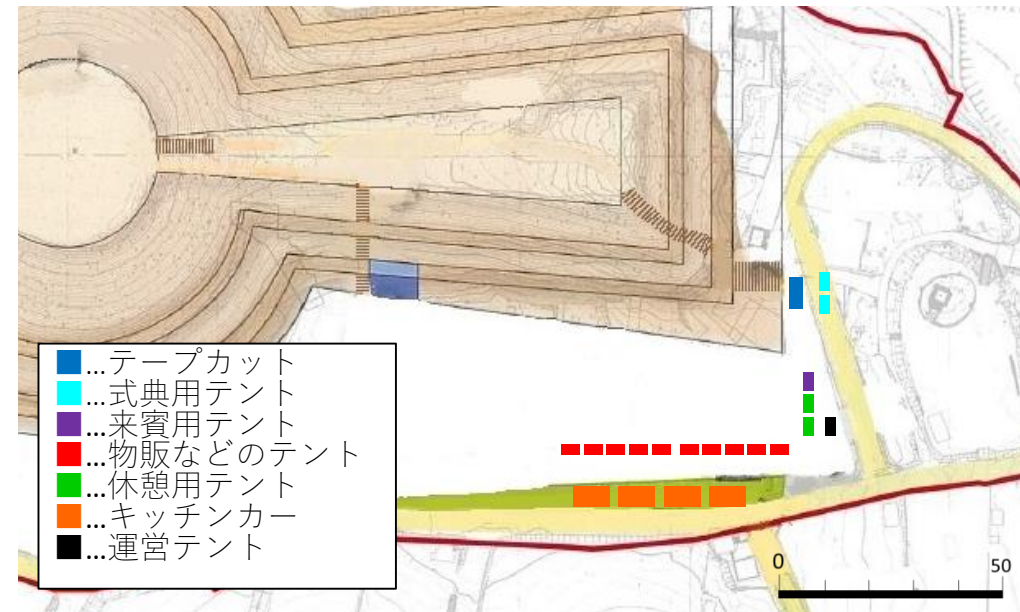

⑩ R7古墳ツアー

⑩オープニングイベントにあわせて開催する日帰りツアー。
特別ゲストにインフルエンサーを起用し、ツアー単体の誘客にとどまらず、メディア露出、SNS拡散による市内史跡の認知度の向上、京丹後市観光公社の定番ツアー化を目指す。
ツアーの行程を⑪R7スタンプラリーと連動させることも想定。
現在、京丹後市観光公社・古墳にコーフン協会と実施に向け、詳細協議中。

【開催概要】 ※ツアー名・金額含め全て予定

「日本海側三大古墳」を中心に、京丹後市・与謝野町内の遺跡・墳墓・古墳を巡る日帰りバスツアー。

ツアー名：まりこふんと行く！丹後三大古墳めぐりツアー 1 day

開催日時：2025年4月27日（日）9:00～17:00 ※開催日変更

定員：40名（最低催行人数：20名）

販売価格：15,000円（予定）

発着：アミティ丹後（京丹後市網野町）※参加者状況により、途中、乗降場所を設ける予定あり

添乗員：あり

その他：特別ゲストとして、まりこふん（古墳シンガー/古墳にコーフン協会会長）が同行。
与謝野町立古墳公園、網野銚子山古墳では地元自治体の埋蔵文化財担当者による特別解説を予定。

⑪ R7スタンプラリー

【実施時期】 令和7年4月26日（土）～8月31日（日）

【内容】 ⑩オープニングイベントにあわせて、「京丹後歴史文化めぐりマップ」のスタンプラリー機能を活用した市内史跡を周遊してもうらスタンプラリーを開催。G.W.や夏休みの旅行者も対象とするため、期間を8月末までに設定。完走者に記念品（ご墳印※⑫のデザインのレアVer.を予定）を授与。

⑫ R7古代の里資料館 企画展示

【実施時期】 令和7年4月下旬～8月下旬（予定）

【内容】 市内にある墳墓・古墳の紹介、出土物などを展示する企画展。
期間は、⑩オープニングイベント合わせでスタートし、⑪スタンプラリー合わせで終了。
スタンプラリーのチェックポイントを網羅することで、互いに補完し誘客を図る。
